



INFORME DE MONITOREO FÍSICO


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Enero - Abril 2024



Proyecto	Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia			
OEE	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			
Código SNIP N°	155			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	122.000.000	GS.	1.038.323.935.698
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
712.760.001.160	325.563.934.538		68,65 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/03/1996	11/03/2016		30/11/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			49,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
101.206.539.759	486.552.000		0,48 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

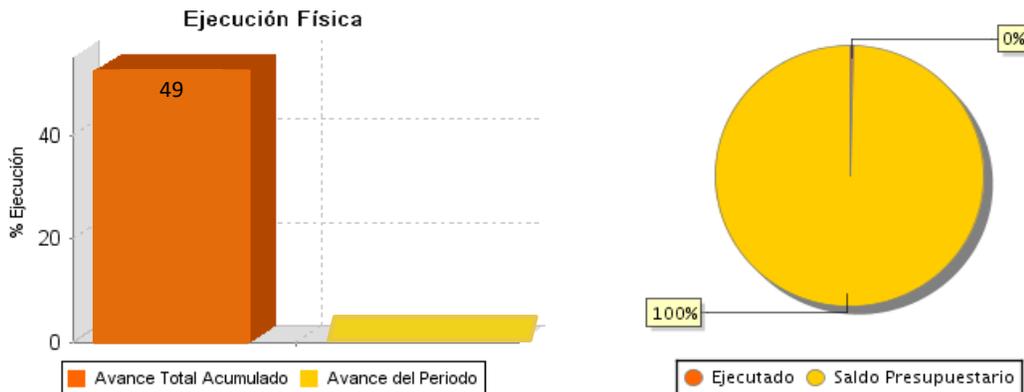

SITUACIÓN ACTUAL

El Proyecto se encuentra en ejecución; la construcción y el mantenimiento del Palacio de Justicia de Ciudad del Este ha terminado. La entidad ha informado que la construcción del Palacio de Saltos del Guairá ha culminado, actualmente en etapa de mantenimiento.

En cuanto a la construcción de Juzgado de 1era Instancia de Capiatá y de Fernando de la Mora, se encuentran ejecutando en éste cuatrimestre 5% y 4,51% respectivamente.
