



INFORME DE MONITOREO FÍSICO


ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Enero - Abril 2024



Proyecto	Construcción de la Línea de Transmisión de 500kv Yacyreta - Villa Hayes			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	159			
Financiamiento	BEI, BID , CAF			
Costo del Proyecto	USD	227.285.710	GS.	1.418.117.767.775
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución		
1.213.686.279.683	204.431.488.092	85,58 %		
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga		
01/07/2014	31/07/2021	31/12/2025		
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Central, Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %	100,00 %			
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado		
17.639.786.527	29.941.793	0,17 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

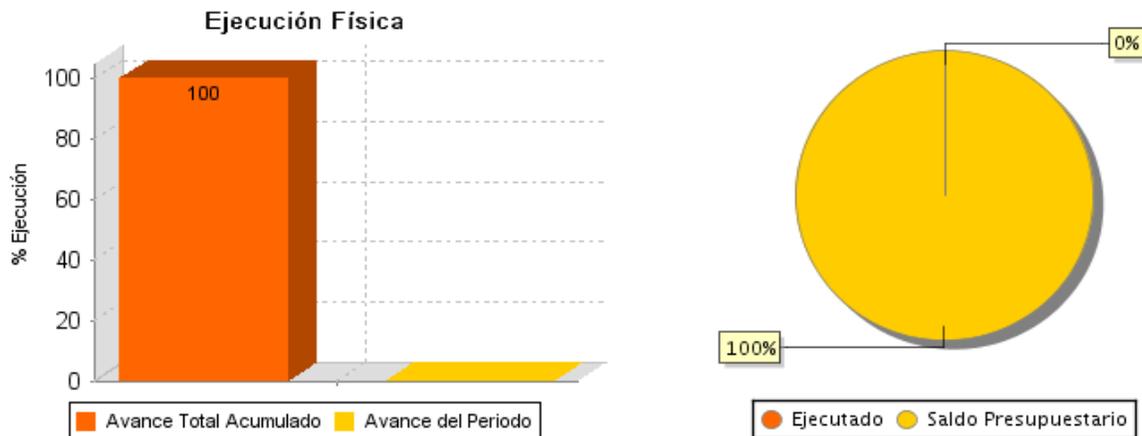


SITUACIÓN ACTUAL

Conforme al cronograma previsto por las unidades administradoras de los contratos, las obras físicas han sido concluidas en su totalidad, no obstante, quedan pendientes los pagos finales de contratos y adendas, pagos de indemnizaciones de casos judicializados y cierre del proyecto.

Proyecto	Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléctrico de la Ande			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	160			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	5.286.000	GS.	53.708.085.988
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
20.096.303.334	33.611.782.654		37,42 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/07/2014	30/06/2022		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
3.400.000.000	233.923.135		6,88 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

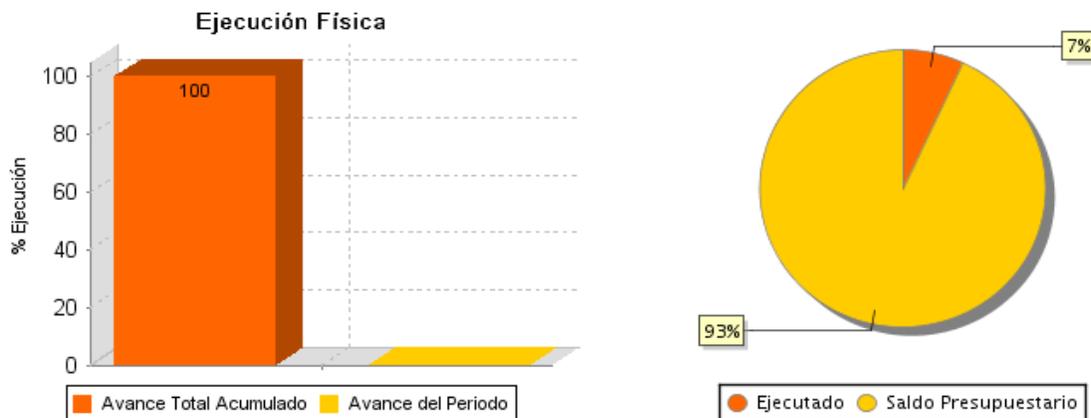


SITUACIÓN ACTUAL

Conforme al cronograma previsto por las unidades administradoras de los contratos, las obras físicas han sido concluidas en su totalidad, no obstante, se encuentra pendiente la cancelación de estados de cuentas finales y el cierre del proyecto.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Área Metropolitana			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	275			
Financiamiento	CAF, OFID			
Costo del Proyecto	USD	121.195.993	GS.	811.546.014.559
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
707.023.926.193	104.522.088.366		87,12 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
05/01/2018	24/03/2021		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
34.020.000.000	975.022.074		2,87 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

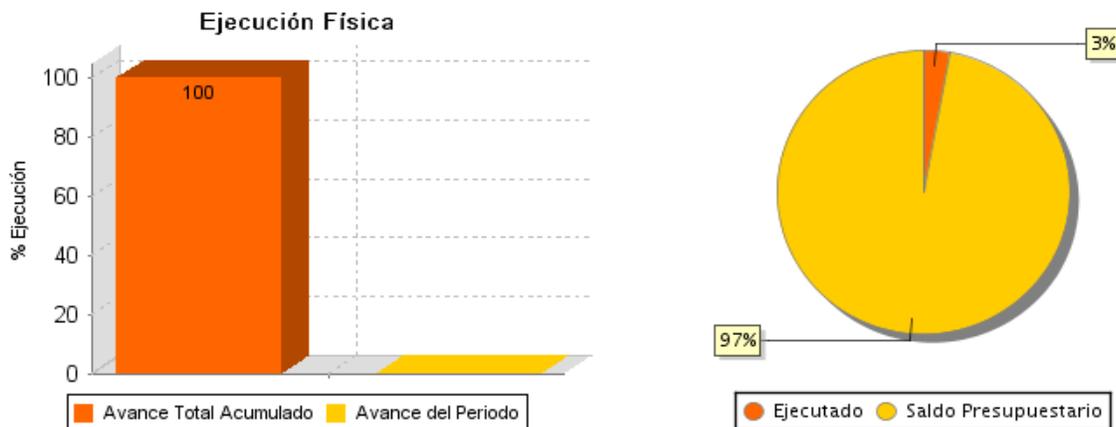


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, las obras se encuentran en etapa de finalización y recepción provisoria. Las Unidades Administradoras de los Contratos se encuentran procesando los cierres de los Contratos y la elaboración de los Estados de Cuentas Finales del Proyecto.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema Eléctrico de la Ciudad de Asunción		
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°	276		
Financiamiento	BEI, CAF		
Costo del Proyecto	USD	51.279.624	GS. 347.753.380.585
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
301.916.571.515	45.836.809.070	86,82 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
12/12/2018	12/11/2020	31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Asunción		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,90 %		96,35 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
30.597.291.867	816.034.859	2,67 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

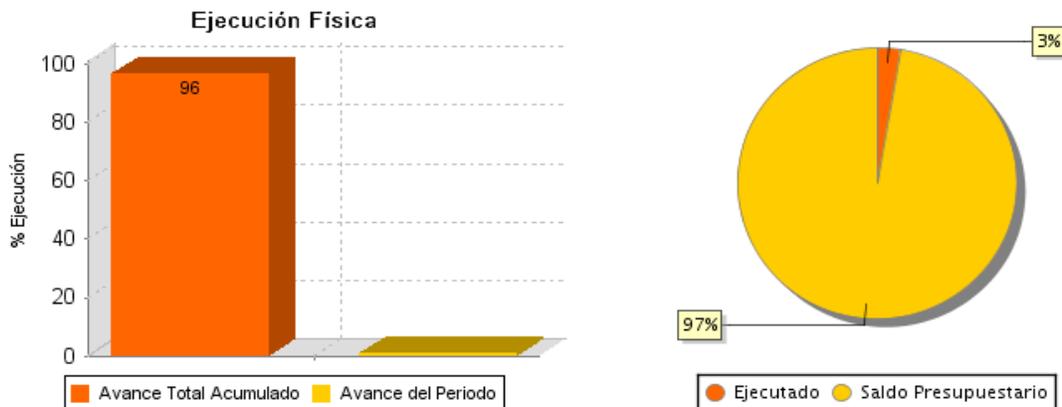


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre, en lo referente al Componente 2 "Repotenciación de Líneas de Transmisión Subterráneas de 66 kV General Diaz-Central y Gral. Diaz-Republicano", la ANDE se encuentra realizando las gestiones para la cancelación del Contrato. En lo concerniente al Componente 3 "Ampliación de la Subestación del Parque Caballero", cabe señalar que las obras de ampliación de la Subestación, se encuentran muy avanzadas en la etapa final de la ejecución. Por otra parte, cabe señalar que en el marco de LPI 1484/2019 "Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Botánico y la Construcción de la LT 220 KV Villa Hayes, Puerto Botánico", Lotes 1 y 2, se encuentran en trámite los reajustes de precios en ambos Lotes.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Los Departamentos de Caaguazú y Alto Paraná			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	277			
Financiamiento	BEI, CAF			
Costo del Proyecto	USD	66.239.968	GS.	665.128.214.159
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución		
465.501.292.848	199.626.921.311	69,99 %		
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga		
12/12/2018	12/11/2020	31/12/2025		
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú			
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total			
2,27 %	96,82 %			
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado		
60.622.364.850	6.660.022.555	10,99 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

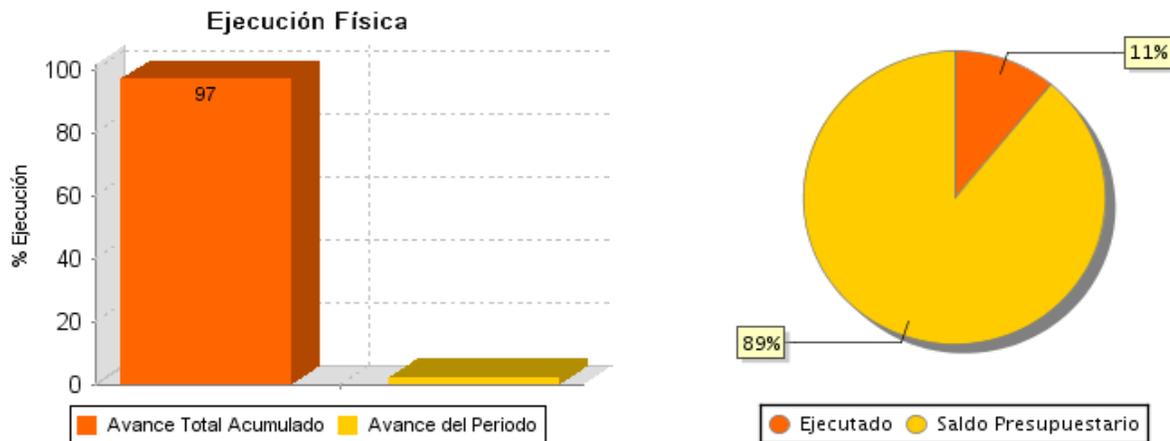


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no ha respondido a las observaciones emitidas por esta Dependencia sobre los avances del Proyecto.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema Eléctrico en el Departamento Central			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	278			
Financiamiento	CAF, OFID			
Costo del Proyecto	USD	93.467.494	GS.	744.055.872.702
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
545.312.423.262	198.743.449.440		73,29 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
05/01/2018	31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,15 %			94,55 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
70.963.138.024	6.495.559.682		9,15 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

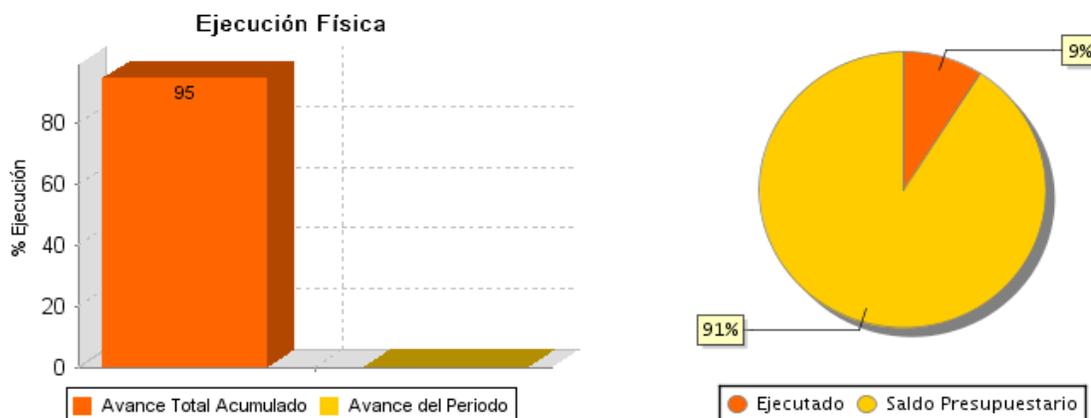


SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances obtenidos en el presente cuatrimestre: En cuanto a la última Actividad en ejecución "Ampliación de la Subestaciones Luque y Capiatá" (LPI 1600/2021- ID 388095), las obras de la Subestación de Luque (adecuación para la instalación de los transformadores de potencia), cuentan con un avance físico del 13%. Sin embargo, el inicio de las obras de ampliación de la ampliación de la Subestación de Capiatá se encuentra supeditada a la aprobación de los planos municipales.

Proyecto		Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica			
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°		560			
Financiamiento		BONOS SOBERANOS			
Costo del Proyecto		USD	9.037.096	GS.	47.029.047.584
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
42.038.207.436		4.990.840.148		89,39 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
06/01/2014		06/02/2016		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Asunción, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
4.677.103.254		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

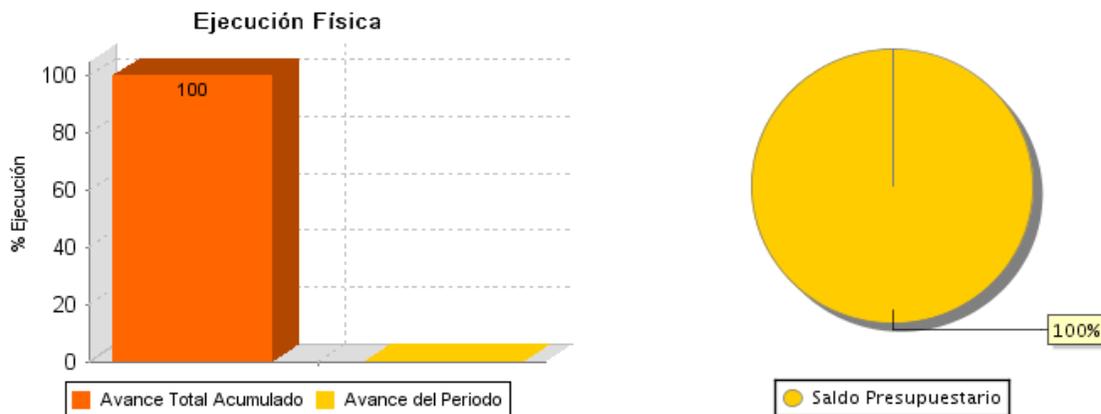


SITUACIÓN ACTUAL

Cabe señalar que, al inicio del presente año, las obras físicas se encuentran concluidas en su totalidad. En el periodo de referencia, se ha solicitado al MEF la ampliación presupuestaria para dar cobertura al pago de Estados de Cuentas Finales pendientes, a través de la Nota P. 1410/24 - Expediente SIME 31.942/2024 . Una vez que se cuente con los créditos presupuestarios, será procederá a la cancelación de los Estados de Cuentas Finales y el cierre efectivo del proyecto.

Proyecto	Construcción de la Subestación Altos 220 KV en Cordillera			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	561			
Financiamiento	BONOS SOBERANOS			
Costo del Proyecto	USD	7.197.275	GS.	37.065.966.250
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
19.474.894.105	17.591.072.145		52,54 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
06/01/2014	31/10/2016		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Cordillera			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
1.237.103.411	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

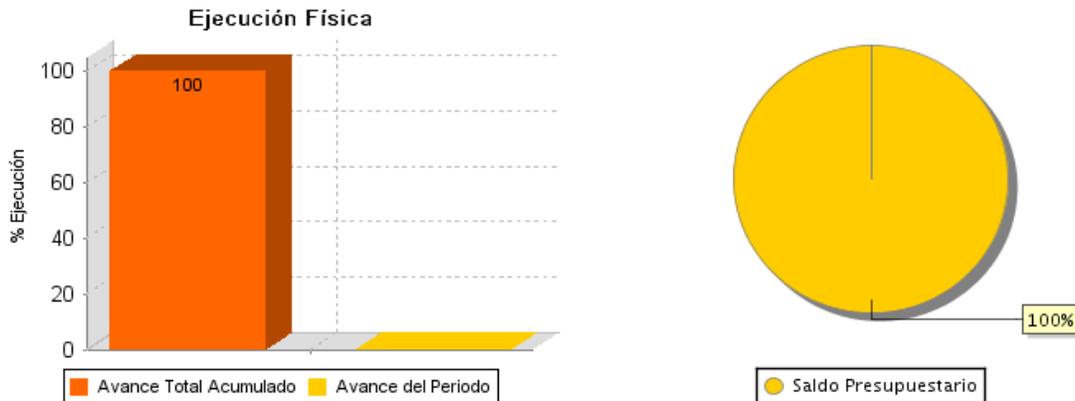


SITUACIÓN ACTUAL

Cabe señalar que, al inicio del presente año, las obras físicas se encuentran concluidas en su totalidad. En el periodo de referencia, se ha solicitado al MEF la ampliación presupuestaria para dar cobertura al pago de Estados de Cuentas Finales pendientes, a través de las Notas P. 1410/24 - SIME 31.942/2024 y Nota P. 1541/24 - Expediente SIME 37.297/2024. Una vez que se cuente con los créditos presupuestarios, será procederá a la cancelación de los Estados de Cuentas Finales y el cierre efectivo del proyecto.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica. Fase II			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	621			
Financiamiento	BEI, CAF			
Costo del Proyecto	USD	152.075.474	GS.	897.171.989.896
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
311.026.855.811	586.145.134.085		34,67 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
12/12/2018	12/12/2021		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Central, Cordillera, Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
3,61 %			23,21 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
446.023.479.762	26.309.942.813		5,90 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

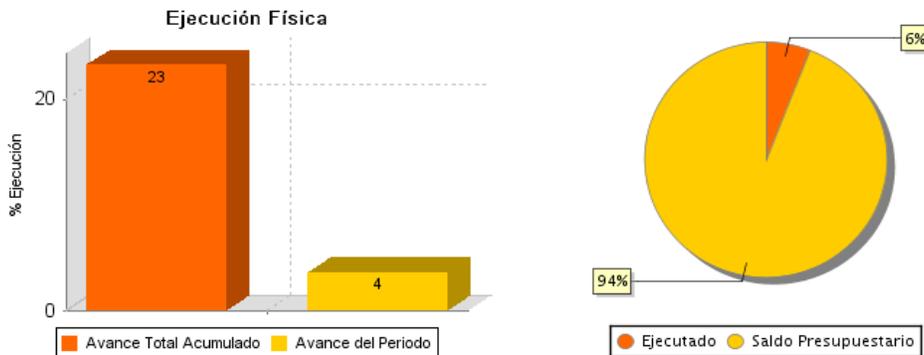


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo, cabe señalar con respecto a los trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del sistema de Distribución del área metropolitana, en distritos del Dpto. Central y Cordillera en media y baja tensión llevado a cabo en el marco de la LPI 1551/2021, que no se han relevado avances en obras, no obstante, se encuentra en proceso la emisión de reajustes de precios, referente a los Lotes 3- Centro de Distribución Itauguá (ITG), y 5- Centros de Distribución Caacupé (CAE) – Ciudad Nueva (CNU). Por otra parte, la LPI 1778/2023 "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos del Departamento Central y Asunción, con Provisión Total de Materiales", se encuentra en etapa de Convocatoria Abierta en la DNCP, con fecha de entrega de ofertas establecida al 25-06-2024.

Proyecto	Reposición de Compensador Estáticos de Reactivos Subestación San Lorenzo			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	706			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	18.000.000	GS.	147.493.037.151
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
118.726.107.908	28.766.929.243		80,50 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
12/12/2018	13/02/2021		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Central, Cordillera, Paraguari, Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,00 %			99,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
2.028.335.652	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

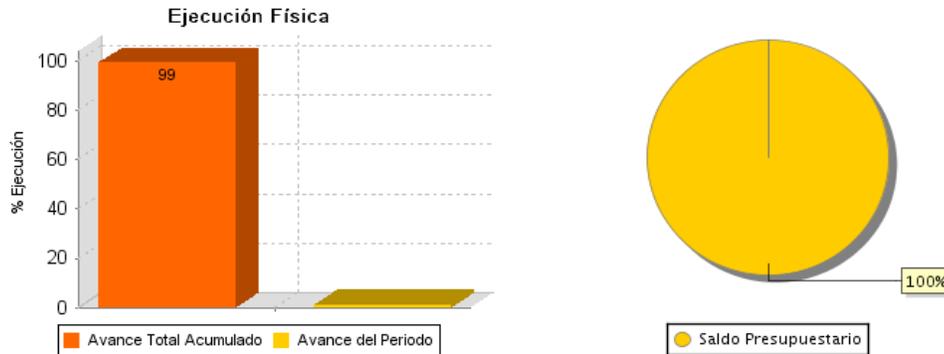


SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto se encuentra en la etapa de finalización. La última actividad en ejecución consiste en la construcción e instalación de sistema de compensación reactiva basado en STATCOM de 220 kV en la Subestación San Lorenzo (LPI 1487/2019), está en etapa de pruebas finales y ajustes y correcciones de los equipos instalados. La Unidad Administradora de Contrato se encuentra gestionando el Convenio Modificatorio N° 2.

Proyecto	Construcción de la Subestación Valenzuela 500 KV en Valenzuela			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	712			
Financiamiento	FONPLATA			
Costo del Proyecto	USD	89.567.653	GS.	661.943.968.863
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
525.475.491.877	136.468.476.986		79,38 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/01/2020	02/01/2023		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caaguazú, Central, Cordillera, Paraguari, Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,76 %			52,45 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
257.197.528.542	28.737.089.792		11,17 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

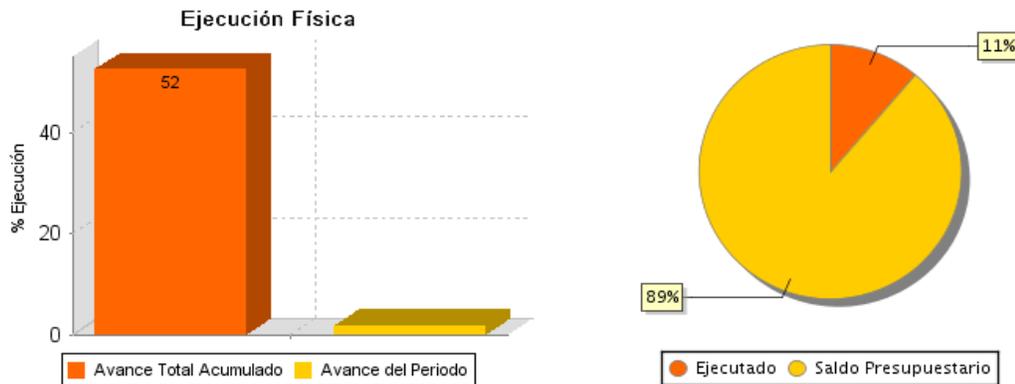


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no ha respondido a las observaciones emitidas por esta Dependencia sobre los avances del Proyecto.

Proyecto	Construcción de la Subestación Iguazú en 500 KV			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	717			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	134.061.629	GS.	1.082.355.319.250
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
886.809.568.630	195.545.750.620		81,93 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
19/07/2019	24/07/2023		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Guairá, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,88 %			96,38 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
37.818.347.870	6.390.350.968		16,90 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

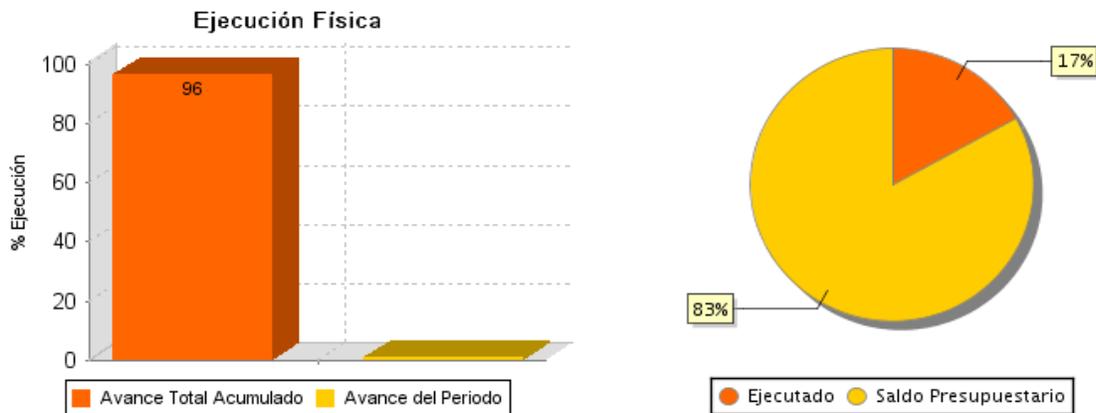


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no ha respondido a las observaciones emitidas por esta Dependencia sobre los avances del Proyecto.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	769			
Financiamiento	BONOS SOBERANOS			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	886.203.853.894
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
684.880.742.090	201.323.111.804		77,28 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/01/2018	02/01/2022		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			95,45 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
14.996.949.004	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

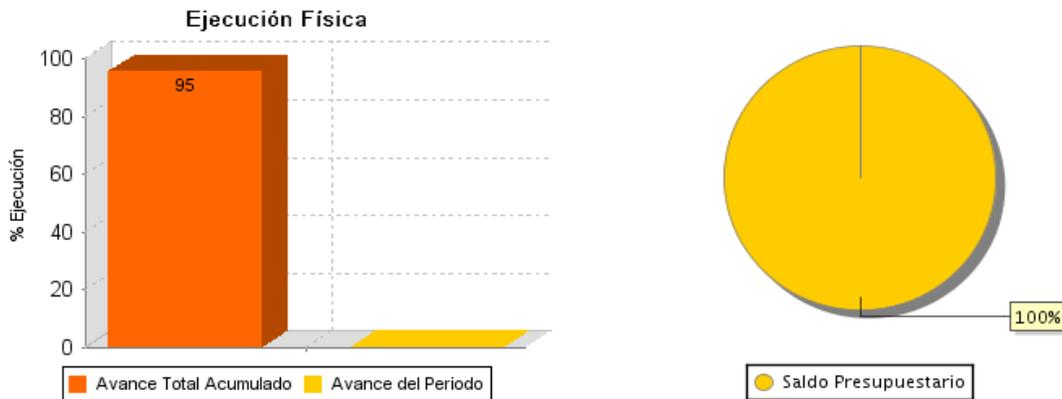


SITUACIÓN ACTUAL

Cabe señalar que, al inicio del presente año, las obras físicas se encuentran concluidas en su totalidad. En el periodo de referencia, se ha solicitado al MEF la ampliación presupuestaria a través de la Nota P. 1410/24 - Expediente SIME 31.942, para dar cobertura al pago de los compromisos pendientes. Una vez que se cuente con los créditos presupuestarios, será procederá a la cancelación de los Estados de Cuentas Finales y el cierre efectivo del proyecto.

Proyecto	Construcción de la Subestación María Auxiliadora y Línea de Transmisión de 220 kV Santa Rita - María Auxiliadora		
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°	776		
Financiamiento	CAF		
Costo del Proyecto	USD	41.754.450	GS. 242.175.803.142
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
165.787.574.978	76.388.228.164	68,46 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
19/07/2019	24/07/2023	31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Itapúa		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
1,80 %	64,92 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
42.289.495.412	2.388.859.236	5,65 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

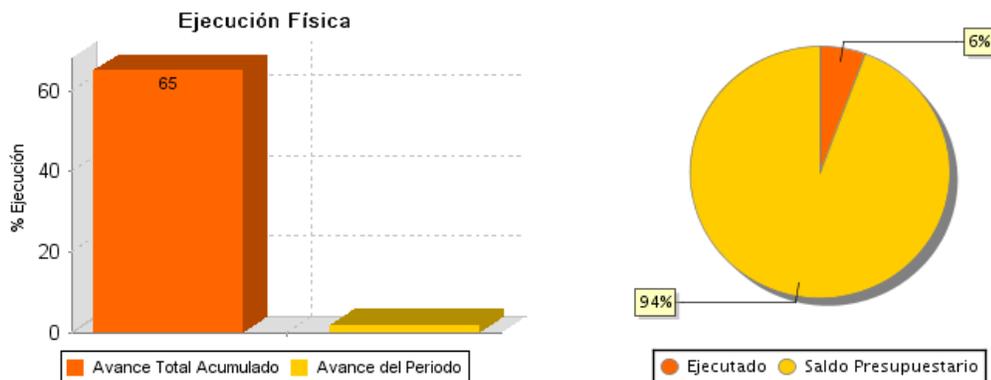


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, los trabajos principales de obras civiles y obras electromecánicas en las Subestaciones de María Auxiliadora y Santa Rita, se encuentran concluidas. Se han concluido los trabajos de campo para el relevamiento planialtimétrico de la traza de la Línea de Transmisión de 220 kV. Las torres B y C se encuentran aprobadas por Ingeniería y se han realizado las pruebas en fábricas. Se cuentan con los permisos municipales y se ha obtenido la licencia ambiental requeridos para el inicio de los trabajos. Se encuentra en gestión la orden de inicio para las obras de construcción de la Línea de Transmisión.

Proyecto	Mejoramiento de 5.000 Km. de Líneas de Baja Tensión y Media Tensión de Autoayuda		
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°	777		
Financiamiento	CAF		
Costo del Proyecto	USD	37.769.686	GS. 219.064.177.460
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
83.456.494.838	135.607.682.622	38,10 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
19/07/2019	24/07/2023	31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
4,60 %		52,40 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
83.314.750.005	7.357.397.835	8,83 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

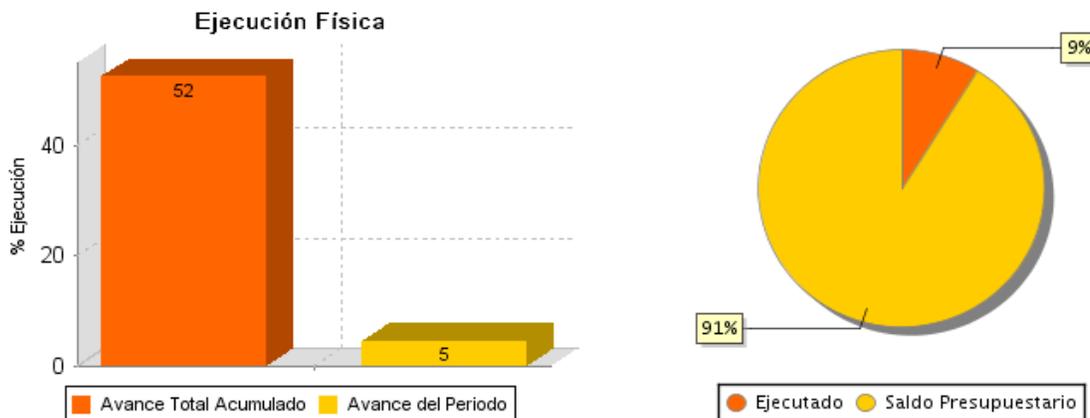


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo, se reportan avances en la ejecución de las Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en media y baja tensión (LPI 1526/2020), se encuentra con un avance en kilómetros de 1.843, los cuales representan el 36,69% del total de kilómetros a ser intervenidos. La fiscalización de obras de mejoramiento de las Líneas de Autoayuda, se encuentra en plena ejecución.

Proyecto	Mejoramiento Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray en Alto Paraná			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	794			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	145.200.000	GS.	1.008.319.620.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
42.213.896.253	966.105.723.747		4,19 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/01/2020	07/01/2026		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,23 %			5,60 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
252.809.738.224	549.507.600		0,22 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

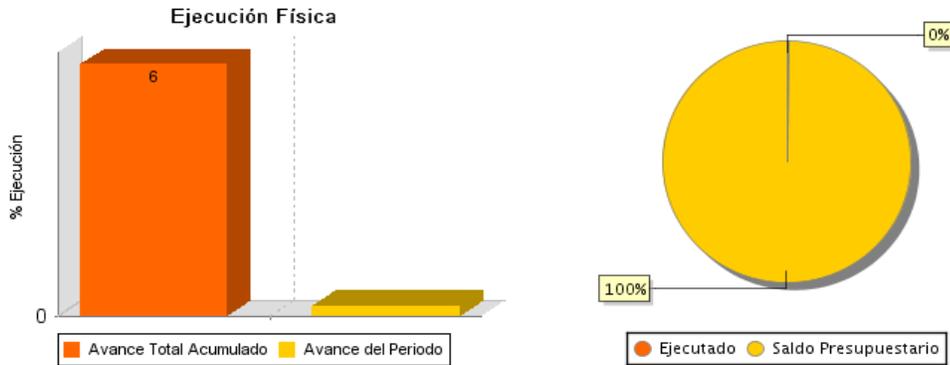


SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances en el cuatrimestre: - La Consultoría SP ANDE - BID N° 3-2022 "Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Coordinación General, Supervisión e Inspección de las Intervenciones del Programa de Rehabilitación y Modernización del Complejo Acaray - Yguazú" adjudicado al Consorcio AFRY y Asociados, conformado por las siguientes entidades: AFRY SWITZERLAND LTD. (SUIZA) - LATINOCONSULT S.A. (ARGENTINA), ha entregado su Primer Informe, que presenta las Alternativas de Solución. - En cuanto a la "Adquisición de Equipos y Herramientas Especiales LPI 1594/2021", se encuentra en procesos de despacho de los suministros del exterior. - En cuanto a la Recapitación y Modernización de la Subestación Acaray, el pliego de bases y condiciones se encuentra en análisis por ente financiador (BID) para la No Objeción para dar inicio del llamado.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Distribución - Fase III RO y PH (Región Oriental y Presidente Hayes)			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	844			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	126.052.910	GS.	875.355.525.559
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
192.122.999.831	683.232.525.728		21,95 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/05/2022	01/05/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total		
8,98 %		28,31 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado		
118.848.107.383	96.000.000	0,08 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

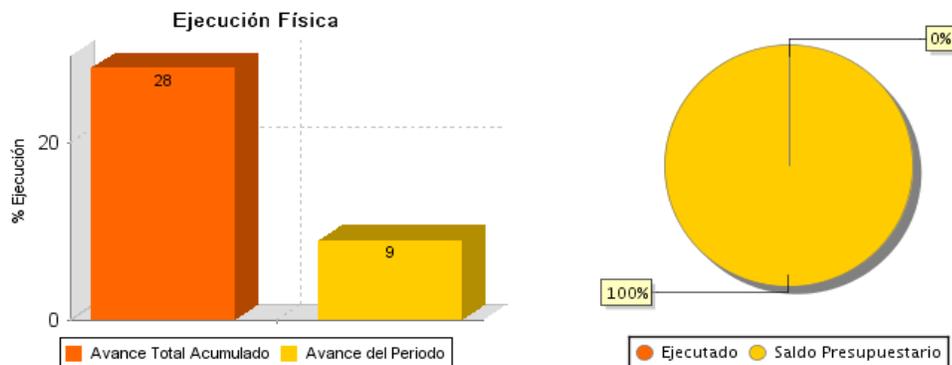


SITUACIÓN ACTUAL

La Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1749/2023, para ejecución de "Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - FASE III", adjudicada a: Lote 1- CONSORCIO LÍNEAS PROTEGIDAS (CDD CONSTRUCCIONES S.A. –DELPAR INGENIERÍA DE PABLO RAMÓN DELGADO SALINAS –DECO S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DE DARÍO RAMÓN BRUN VERA – ROTEL INGENIERÍA S.R.L.); Lote 2- CONSORCIO ISS (INGELCO S.R.L. – SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETTOVELAR – SERVICIOS ELÉCTRICOS Y METALÚRGICOS S.A. (SEMESA)); Lote 3- CONSORCIO ELÉCTRICO DEL ESTE (L.T. S.A. – ABUNDIO LÓPEZ IBARRA); Lote 4- CONSORCIO ELÉCTRICO CCS (CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. –SINGEL S.A. – CONCRET - MIX S.A.); Lote 5- CONSORCIO DEL ESTE (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. (ESTESA S.A.) – SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGÜELLO), cuentan con el 100% de apertura de Cartas de Créditos, se encuentran pendiente de la adjudicación de la Fiscalización para dar inicio a las obras.

Proyecto	Equipamiento Adquisición de Subestaciones Móviles de 220/23 KV y 66/23 KV				
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD				
Código SNIP N°	848				
Financiamiento	CAF				
Costo del Proyecto	USD	20.086.365	GS.	146.495.684.991	
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución		
101.579.542.113	44.916.142.878		69,34 %		
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga		
01/05/2022	01/05/2024		31/12/2025		
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional					
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			14,21 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado		
151.746.313.462	0		0,00 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

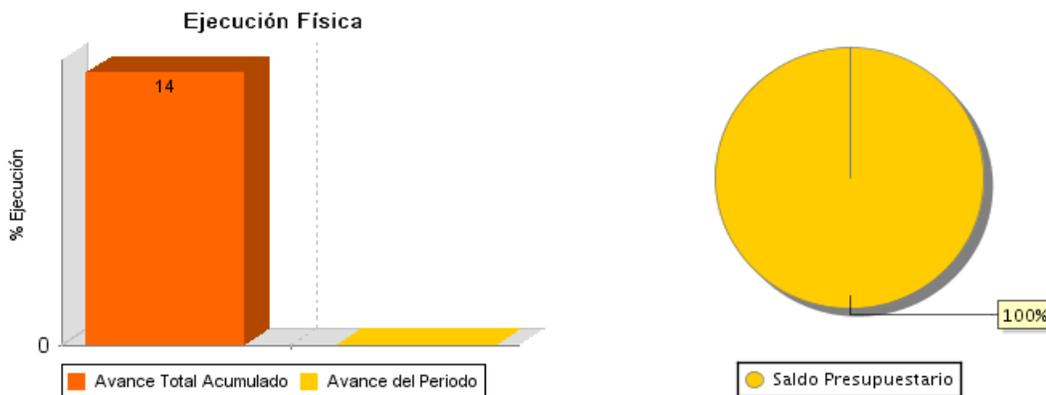


SITUACIÓN ACTUAL

La Entidad ha reportado que en el periodo de referencia, no se han obtenido avances físicos en el marco de ejecución del Proyecto. Cabe señalar igualmente que en el ejercicio 2023 se ha finiquitado un proceso licitatorio para la adquisición de Subestaciones Móviles (LPI N° 1687/2022), el cual, posteriormente, fue declarado desierto considerando la Resolución DNCP N° 819/23, habiéndose realizado el reintegro de los recursos aplicados para la Apertura de las Cartas de Crédito Internacionales a la Cuenta Operativa del Proyecto.

Proyecto	Mejoramiento Gestión del Sistema Eléctrico de Distribución-SGIDE			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	886			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	100.227.735	GS.	702.960.821.547
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
244.313.451.089	458.647.370.458		34,75 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/05/2022	01/05/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2,48 %			22,11 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
339.416.351.662	11.224.527.445		3,31 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

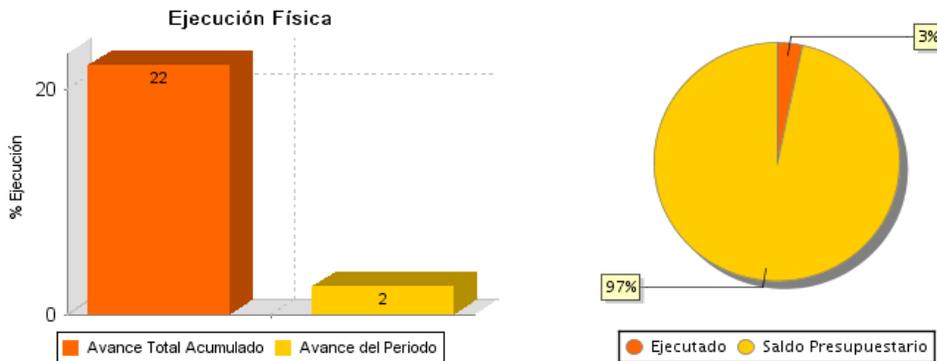


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se reportan los siguientes avances:

- Ajuste el Pliego de Bases y Condiciones para la Construcción de un edificio para Centro de Operación Nacional de Distribución y Data Center y la adecuación edilicia de los centros de operación regional de distribución.
- Se encuentra en ejecución los Servicios de comunicación y de conectividad 3G/LTE para equipos telecomandados de distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto - LPN 1786/2023
- Se encuentra en ejecución la Adquisición, Instalación e Integración de Llaves Telecomandadas para Distribución - LPI 1706/2022
- Se encuentra en ejecución los Servicios técnicos y profesionales de la asistencia técnica a la unidad SGIDE. (ECATEF) - LPN 1701/2022
- Se encuentra en ejecución los Servicios de Consultoría para Asistencia Técnica Especializada (ATE) de apoyo en la implementación de un Sistema de Gestión Integral de Distribución Eléctrica – SGIDE - LPI 1690/2022
- Se encuentra en proceso el Desarrollo y puesta en servicio del sistema de información geográfica (GIS Smallworld Electric Office) - LPI 1723/22

Proyecto	Construcción de la Línea de Transmisión de 500 KV Yguazú - Valenzuela			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	897			
Financiamiento	BID , JICA			
Costo del Proyecto	USD	157.780.124	GS.	978.236.768.800
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
160.624.397.073	817.612.371.727		16,42 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
15/09/2023	15/09/2029		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			8,71 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
364.503.591.068	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

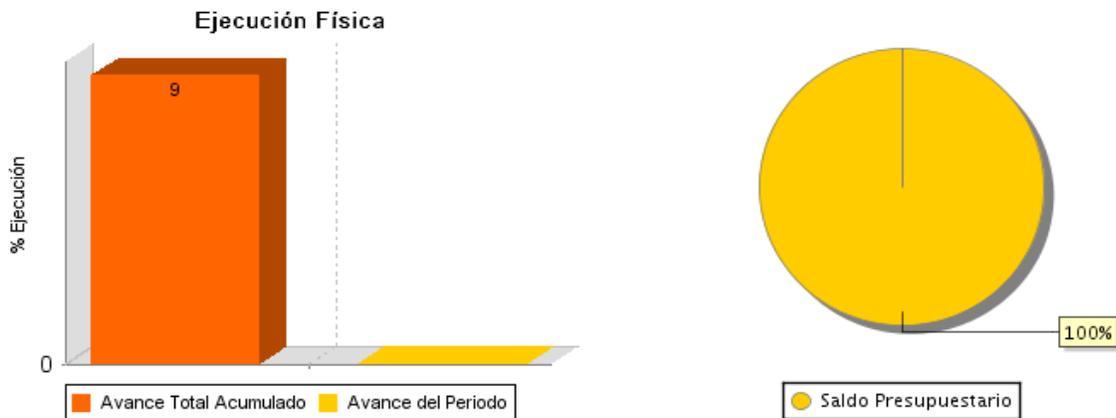


SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto fue aprobado por la Ley de la Nación N° 7147 de fecha 15 de Setiembre de 2023. En diciembre de 2023 arrancó la ejecución física y financiera del proyecto con la Apertura de Cartas de Crédito correspondientes a la LPI ANDE-BID-JICA N° 1684/2022. En el primer cuatrimestre del presente año se solicitó la ampliación presupuestaria al MEF a través de la Nota P. 1163/2024, en fecha 04/04/2024, mediante el Expediente SIME N° 29204-2024, el cual se encuentra en proceso de aprobación a fin de avanzar en la ejecución del proyecto.

Proyecto	Mejoramiento de la Eficiencia Energética de la Red de Alumbrado			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	900			
Financiamiento	BID , JICA			
Costo del Proyecto	USD	15.232.700	GS.	97.215.091.464
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0	97.215.091.464		0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
15/09/2023	15/09/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Asunción			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			0,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
50.570.382.947	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

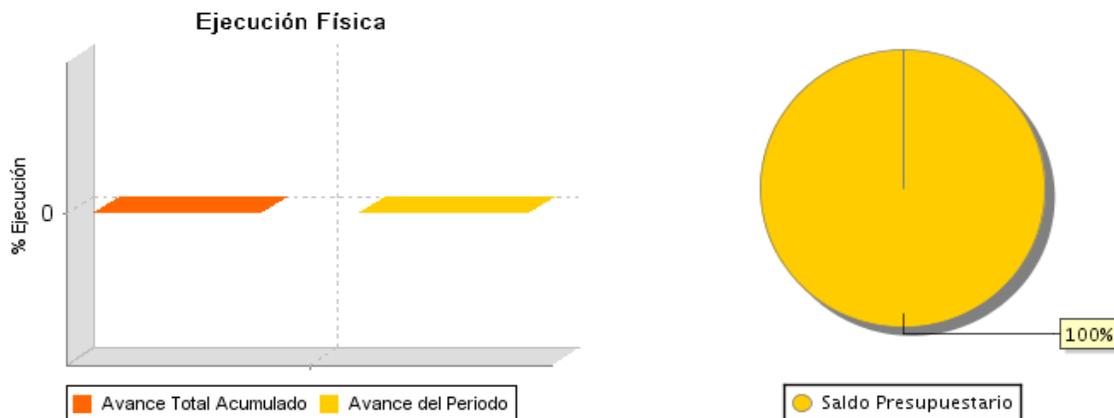


SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto fue aprobado por la Ley de la Nación N° 7147 de fecha 15 de Setiembre de 2023. En el primer cuatrimestre del presente año se solicitó la ampliación presupuestaria al MEF a través de la Nota P. 1163/2024, en fecha 04/04/2024, mediante el Expediente SIME N° 29204-2024, el cual se encuentra en proceso de aprobación a fin de iniciar la ejecución del proyecto.

Proyecto	Construcción de la Línea de Transmisión De 220 Kv Villa Hayes/ Villa Real/ Pozo Colorado/ Loma Plata y Subestación Pozo Colorado		
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°	961		
Financiamiento	FONPLATA, KFW		
Costo del Proyecto	USD	126.126.140	GS. 882.882.780.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
0	882.882.780.000	0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
1/4/2024	31/12/2026	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Boquerón, Concepción, Presidente Hayes		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
6,81 %	6,81 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
601.400.043.409	0	0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

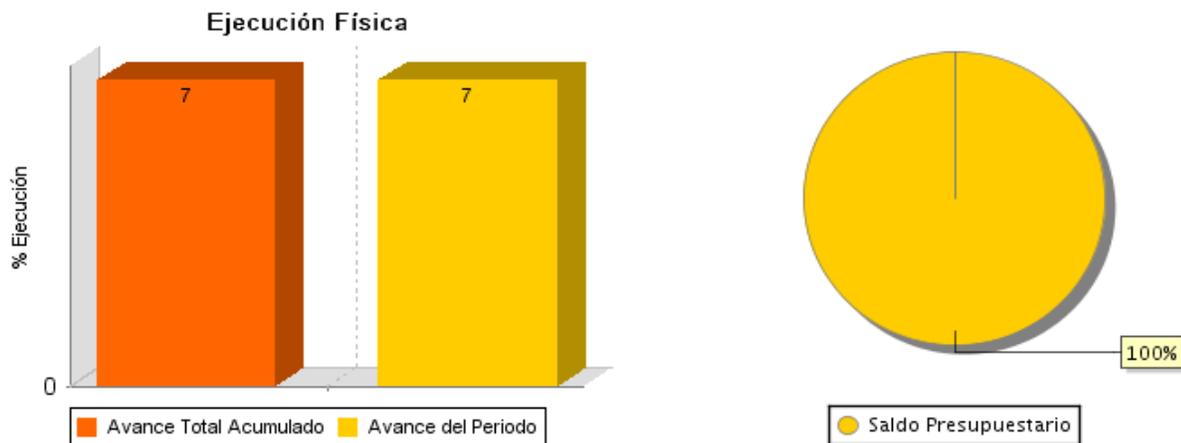

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no ha respondido a las observaciones emitidas por esta Dependencia sobre los avances del Proyecto.
