



INFORME DE MONITOREO FÍSICO



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Enero - Abril 2024



Proyecto	Sp Programa Nacional Caminos Rurales 2° Etapa Fase II BID 2163/Oc-2164/BI-OFID			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	36			
Financiamiento	BID, JICA , LOCAL, OFID			
Costo del Proyecto	USD	170.000.000	GS.	925.666.587.755
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
837.661.854.130	88.004.733.625		90,49 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/01/2011	04/01/2016		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,91 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
2.856.245.387	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

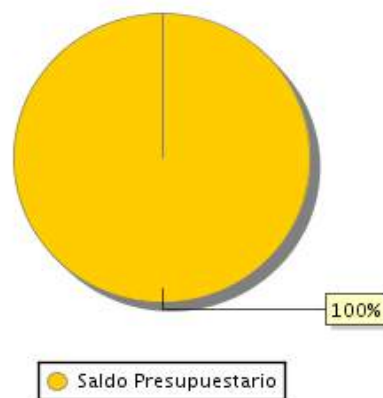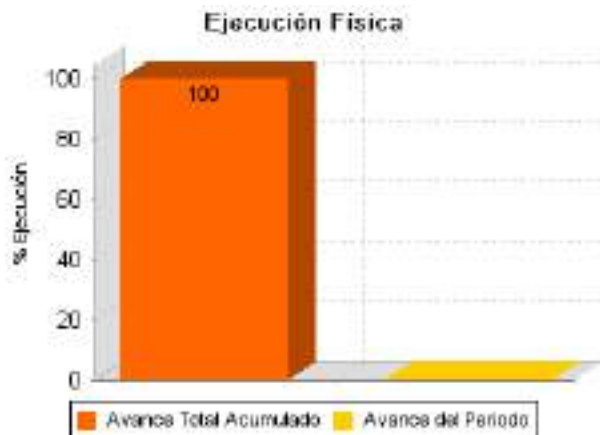


SITUACIÓN ACTUAL

La totalidad de las obras del proyecto han culminado. Queda pendiente el pago de certificados, adendas, reajuste e intereses moratorios.

Proyecto	SP Construcción Avenida Costanera, Centro Histórico y Parque Bicentenario			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	67			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	533.875.437.551
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
529.279.114.406	4.596.323.145		99,14 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2012	31/12/2023		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,35 %			99,34 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al	30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
4.684.251.431	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

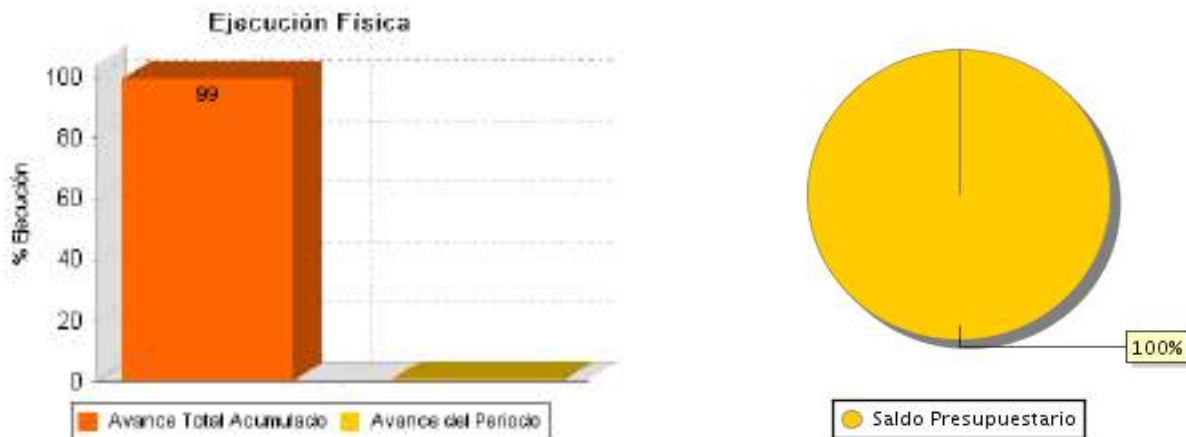


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras referentes a la construcción y equipamiento del Parque Lineal Costero de Asunción se encuentran culminadas y en trámite los procesos para la recepción provisoria, en atención a lo establecido en la Cláusula 46 "Recepción Provisoria de Obras" de las Condiciones Generales del Contrato.

Proyecto	SP Proyecto Acueducto		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	80		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 506.204.353.201
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
435.491.513.810	70.712.839.391		86,03 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
26/10/2012	26/01/2015		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		99,78 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
2.582.306.393	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

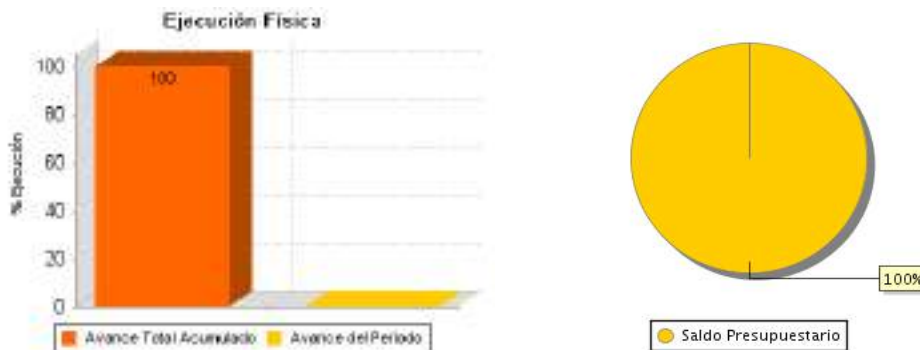


SITUACIÓN ACTUAL

El Montaje del Sistema de Automatización y Operación del Acueducto Principal tramo Puerto Casado – Loma Plata, ha concluido, se encuentra en proceso de recepción definitiva, una vez que se le otorgue la recepción definitiva, se dará inicio al proceso de pago del fondo de Reparación. Actualmente la ESSAP S.A. se encarga de la operación, distribución y mantenimiento de la toma de agua cruda y de la planta de tratamiento de la ciudad de Puerto Casado, donde distribuyen agua a dicha ciudad.

Teniendo en cuenta lo de ESSAP que no cubre todo el acueducto se necesita prever actividades de mitigación para el mantenimiento y operación de las obras del acueducto, haciendo lugar a las recomendaciones recibidas por la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna Institucional.

Proyecto	SP Reconversión Zona Puerto de Asunción Centro Oficinas CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	83		
Financiamiento	BID , LOCAL, OFID		
Costo del Proyecto	USD	359.837.510	GS. 1.102.749.246.391
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.060.696.855.255	42.052.391.136		96,19 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
24/12/2013	27/12/2018		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,03 %		57,81 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
48.850.402.549	2.947.608.864		6,03 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

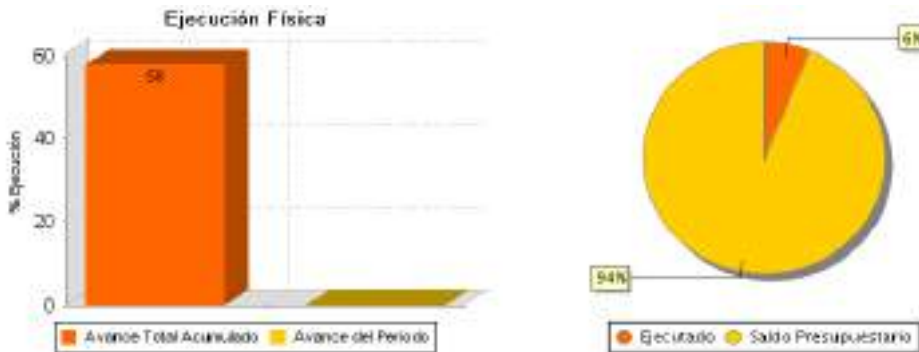


SITUACIÓN ACTUAL

La Obras de Restauración del Edificio Histórico del Puerto de Asunción, cuenta con un avance físico, incluyendo sus convenios modificatorios del 100%. La recepción provisoria de obras, fue firmada con sus respectivas observaciones en julio del 2023. En la actualidad las obras se encuentran en el periodo de garantía, la contratista ha subsanado los pendientes observados en la recepción provisoria. La inauguración del edificio se llevó a cabo en el mes de diciembre del 2023. El edificio fue entregado en fecha 31 de enero del 2024, por Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), a la Secretaria Nacional de Cultura (SNC), para las diferentes actividades turísticas y culturales, y de participación de la ciudadanía. Por falta de recursos presupuestarios en fondo local, se cuenta aún con saldos pendientes de pago. La Obras de las Oficinas de Gobierno ya cuentan con recepción provisoria en su totalidad. La torre del MEC, MOPC, MUVH, MTESS-SET, DNIT, Auditorio, Comedor e Instalaciones en general, cuentan con un avance del 100%, como así también el sub-suelo con un avance del 100% y el Eje Cívico en General con un avance del 100%. Se entregaron todos los informes finales de la fiscalización, correspondiente a las obras de las Oficinas de Gobierno, quedando pendiente el informe final con la recepción definitiva a partir de fines de mayo del 2024. Sigue pendiente la aprobación final de toda la obra por parte de la Municipalidad de Asunción hasta tanto se realicen la implementación de las medidas de mitigación de acceso vial y tránsito ordenadas por la misma. Actualmente con las ODG sigue en el periodo de garantía con TBI hasta mayo del año 2024, la contratista se encuentra subsanando los reclamos que van apareciendo con el uso de las instalaciones (vicios ocultos), quedando pendiente recepción definitiva de las obras. Se obtuvo la resolución de la recepción definitiva y se firmó el acta en fecha 11 de abril del corriente de la obra línea 23.000 Voltios, teniendo así un avance del 100%. Por su parte, el proceso de Arbitraje Internacional con respecto al Programa BTR, ya está concluido, con un resultado no favorable para el MOPC. La Procuraduría General de la República (PGR), comunicó que apelaría la decisión del Juzgado Internacional.

Proyecto	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco ï - General Bruguez		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	882		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	215.000.000	GS. 1.485.662.900.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
178.430.414.637	1.307.232.485.363	12,01%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
09/09/2022	9/9/2028	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Presidente Hayes		
Avance Físico Reportado del Período	Avance Físico Acumulado Total		
2,02 %	11,39 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
88.614.000.000	3.865.436.335	4,36 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

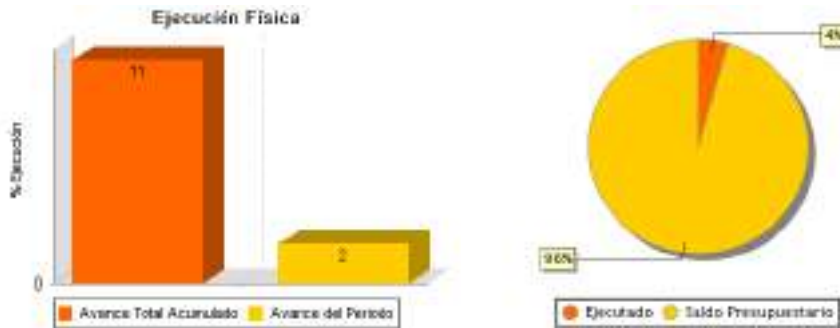

SITUACIÓN ACTUAL


"Proyecto de construcción de la Ruta Py 12 Tramo Chaco ï-Gral Bruguez. A continuación, detallamos el avance: a. se realizó el llamado de obra ID N° 418.689/2023, Llamado Mopc N° 83/2022 Licitación Pública Internacional para la contratación de empresas constructoras para la ejecución de obras viales de habilitación y mantenimiento de la Ruta Nacional 12 (PY12). Tramo Cruce Nanawa - Gral Bruguez y Accesos Región Occidental; fueron adjudicados los 4 lotes, la orden de inicio se emitió para el lote 3 en el mes de febrero, los otros lotes están sujetos la emisión de la orden de inicio una vez que sea firmado los contratos de las fiscalizaciones.

En el 1er cuatrimestre los llamados de Fiscalizaciones se encuentran en proceso de Firma de Contrato 1. ID N° 430.352 Llamado MOPC LPI para la contratación de firma consultora para el servicio de fiscalización de las obras de habilitación y mantenimiento del lote 1 de obras del Tramo Cruce Nanawa- Gral Bruguez y accesos (PY12), 2. ID 430.356 llamado MOPC LPI para la contratación de firma consultora para el servicio de fiscalización de las obras de habilitación y mantenimiento del lote 2 de obras del tramo cruce Nanawa- Gral Bruguez y accesos (PY12) 3. ID N° 430.360 Llamado MOPC LPI para la contratación de firma consultora para el servicio de fiscalización de las obras de habilitación y mantenimiento del lote 4 de obras del Tramo Cruce Nanawa- Gral Bruguez y accesos (PY12).

El llamado MOPC ID N° 430.358 para la contratación de firma consultora para el servicio de fiscalización de las obras de habilitación y mantenimiento del lote 3 de obras del tramo Cruce Nanawa- Gral Bruguez y accesos (PY12) fue adjudicado y firmaron contrato, ya se emitió orden de proceder.

Proyecto	SP MejorasTravesias Urbana Cuidades de Paraguari-Carapegua-Quiindy-Caapucu			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	91			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	153.606.820.275
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
155.960.458.418	-2.353.638.143		101,53%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
N/A	N/A		31/12/2022	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Caapucú, Carapeguá, Paraguari, Quiindy			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
530.823.440	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

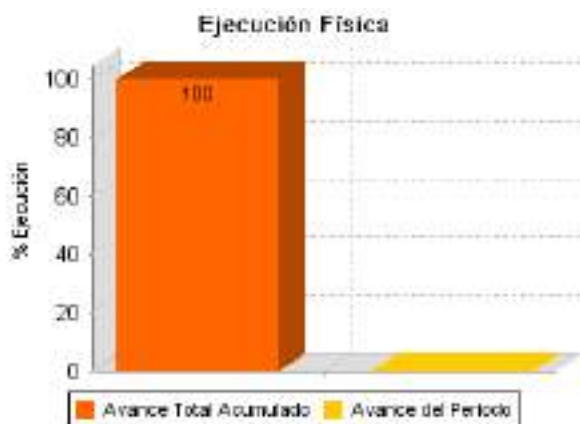


SITUACIÓN ACTUAL

Es un proyecto previo a la vigencia del SNIP. La obras que abarca el proyecto han culminado. Actualmente pendiente el pago a frentistas por indemnización.

Proyecto	Sp Programa Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	149		
Financiamiento	AECID, BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	88.000.000	GS. 635.532.769.647
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
550.074.205.259	85.458.564.388	86,55 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
23/11/2012	23/11/2017	31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Período	Avance Físico Acumulado Total		
0,67 %	93,22 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
88.180.369.839	14.712.309.436	16,68 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

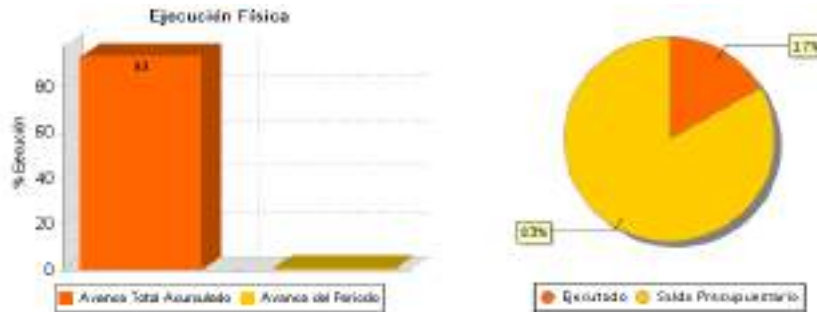

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto se encuentran en ejecución. A continuación se detallan los avances obtenidos al cabo de éste primer cuatrimestre:

1. Las obras de Construcción de Aductoras, Centro de Distribución y Estaciones de Bombeo en el Chaco Central y la Construcción de Redes de abastecimiento de Agua Potable a comunidades indígenas y localidades menores beneficiarios con el proyecto del Acueducto del Chaco Central: han concluido y cuenta con recepción definitiva. Se se realizaron los pagos de reajustes, y se continuaron con los tramites inherentes a la cancelación del fondo de reparo, que serán pagados durante el segundo cuatrimestre del 2024.

2. El avance de las Obras de Ciudades Intermedias Región Oriental que consiste en Infraestructura para Sistema de Recolectión y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable de las siguientes localidades:


2.1. *Caacupé:* Construcción redes nuevas: 100% Revisión de Red preexistente: 100%, Línea de Impulsión de EB1 a PTAR: 85,61%, Movimiento de suelo en PTAR: 100%. Se continuo con las obras de las conexiones domiciliarias con un total acumulado de 1700 conexiones quedando pendiente 1100, adicionalmente se tiene previsto 6 meses de periodo de operación y mantenimiento.

2.2. *Tobati:* Redes Básicas 87%, Redes Condominiales 85%, Estaciones de Bombeo y Línea de impulsión 15%, PTAR 30,15%. Se completó el legajo para el Convenio Modificadorio que habilita las cantidades y plazo suficientes para la culminación de la PTAR cuyo financiamiento esta previsto con contrapartida local, teniendo en cuenta que las cantidades hoy existentes no son suficientes para la culminación de la mismo aparte de cuestiones presupuestarias.

2.3. *Horqueta:* Redes Básicas 106%, Redes Condominiales 109%, Mejoramiento del Agua 100%, PTAR 99,8%, Estaciones de Bombeo N° 1= 95% y N°5= 95%. Se estima concluir en el mes de mayo/2024. También se tiene previsto un plan de incentivo para las conexiones efectivas que iniciará con el periodo de operación y mantenimiento que durará 6 meses.

Proyecto		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		154			
Financiamiento		BID , JICA , LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	332.984.000	GS.	2.026.829.087.180
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
1.459.752.436.239		567.076.650.941		72,02 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/10/2014		28/10/2021		28/10/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Itapúa				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,76 %			91,06 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
295.997.219.680		18.833.105.365		6,36 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

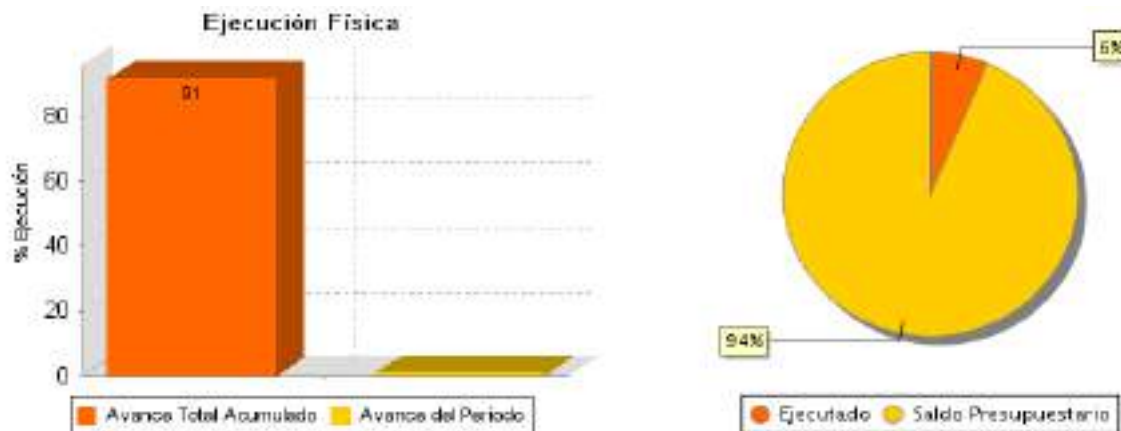

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	162			
Financiamiento	CAF, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	285.000.000	GS.	1.643.841.538.888
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
1.569.086.838.124	74.754.700.764		95,54 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
29/10/2014	31/12/2018		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,51 %			91,40 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
151.961.330.429	8.036.537.365		5,29 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el presente periodo se reportaron los siguientes avances:

- 1) Mantenimiento de rutas pavimentadas; se ha mantenido 57,9 km. en el tramo Mariscal Estigarribia - La Patria, siendo las principales actividades la limpieza de franja de dominio, sellado de fisuras entre otros.
- 2) Construcción de la Circunvalación de Acceso a la Ciudad de Curuguaty; aun no presenta avances en la capa asfáltica, sin embargo se trabajó en el terraplenado.
- 3) Construcción del Puesto de Peaje en el tramo Villeta - Alberdi, se encuentra adjudicada a la espera de la Orden de Inicio de los trabajos.
- 4) Construcción de Peaje en Curuguaty; se encuentra en etapa de actualización de precios en el Pliego, Base y Condiciones (Pbc). para la realización del llamado.
- 5) Construcción de Obras Complementarias Villeta Alberdi; la ejecución de la obra ha concluido. Actualmente en proceso de recepción definitiva y devolución de las retenciones.

En cuanto a la consultoría de Monitoreo Ambiental y Social del Proyecto; fue rescindido el contrato por Resolución Ministerial N° 1299.

Proyecto	Mejoramiento Pavimentación Corredor Integral Rehabilitación Mantenimiento Red Vial (Fase II)		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	195		
Financiamiento	BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	200.800.000	GS. 1.399.274.027.789
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
1.399.200.291.050	73.736.739	99,99 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
01/11/2013	16/09/2021	31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Itapúa, San Pedro		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
0,27 %	99,73 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
143.855.107.233	26.365.586.522	18,33 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

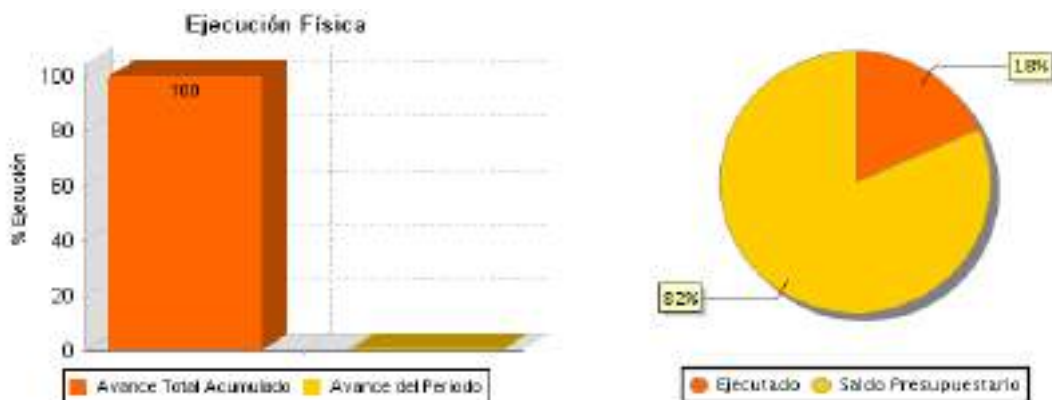

SITUACIÓN ACTUAL

En este cuatrimestre se informa que la totalidad de las obras que abarca éste proyecto ha culminado. Quedan pendientes la culminación de la auditoría y la cancelación de las deudas pendientes de los certificados de obras.

Proyecto		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		219			
Financiamiento		CAF, LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	71.706.681	GS.	311.671.052.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
293.933.764.756		17.737.287.244		94,31 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
20/10/2014		20/10/2014		22/7/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
2.732.246.870		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Proyecto concluido. Existen deuda pendientes en concepto de Reajuste, Devoluciones de Retenciones y Devolución de pagos de IVA.

Proyecto	Construcción de Sistema Agua Potable y Acceso Vial Penitenciaria Minga Guazu			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	245			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	12.710.486	GS.	87.702.350.260
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución		
20317707520	67384642740	23,17 %		
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga		
01/10/2022	01/10/2023	31/12/2024		
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Minga Guazú			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %		50,96 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado		
1.271.721.342	141.944.668	11,16 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

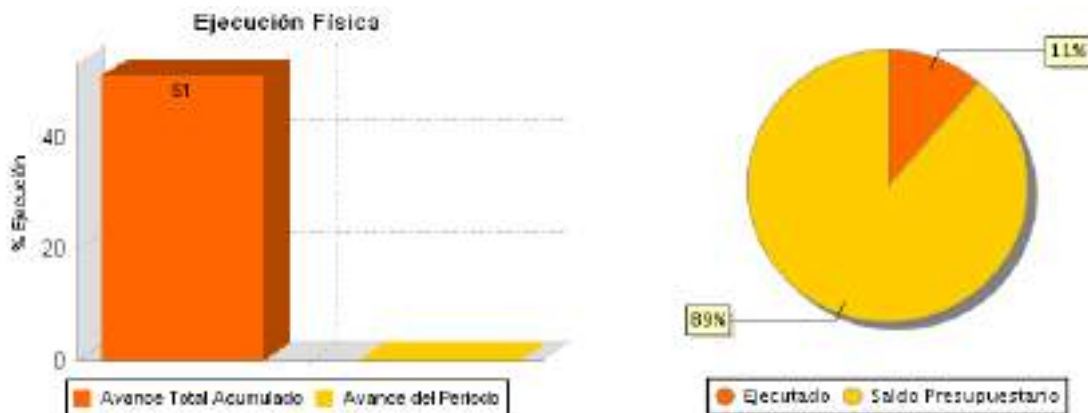


SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en cuanto a lo que respecta a la Planta de agua potable, la red de distribución, cámara frigorífica y montacargas, obras menores de mampostería, revoque y pintura ya cuenta con Recepción Definitiva de fecha 14/03/2024. Igualmente la Actividad correspondiente al Sistema de Vigilancia electrónica, equipamientos de informática, mobiliarios de oficina, de sanidad, también ya fue recibida con documentos .

Proyecto	Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	259		
Financiamiento	FONPLATA, LOCAL, OFID		
Costo del Proyecto	USD	125.250.000	GS. 1.088.311.181.109
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
1.044.622.877.128	43.688.303.981	95,99 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
16/05/2016	22/06/2021	30/06/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Municipal	Alberdi, Guazú Cuá, Pilar, San Juan B. de Ñeembucú, Villa Franca		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
0,21 %	94 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
76.071.923.288	19.779.621.274	26,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

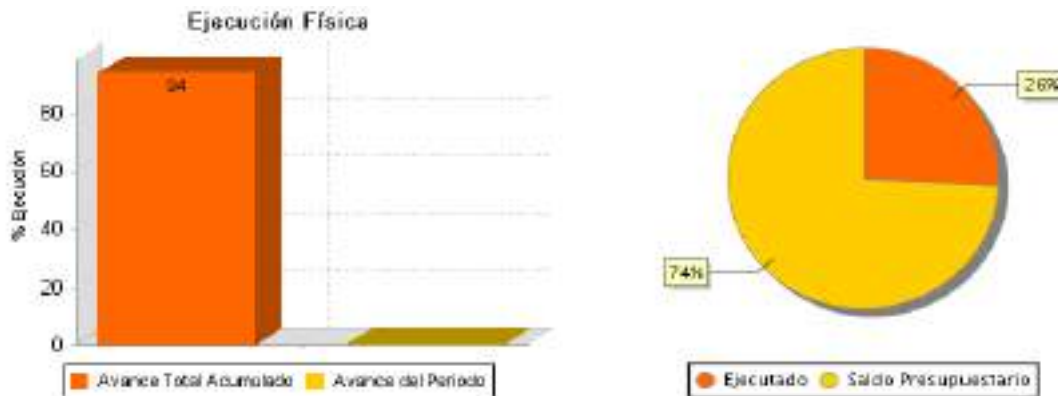


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia se reporta que la Obra 1: Que abarca desde el desvío de Albedriar hasta el Río Tebicuary y la Travesía Urbana de Villa Franca, se encuentra en etapa de culminación las obras complementarias, como señalización horizontal repintado, trabajos de mantenimiento como protección y reconfirmación de taludes y a la espera de colocación de verandas metálicas en el lugar previsto. Con respecto a la Obra 2: Que se extiende desde el Río Tebicuary hasta Pilar y Acceso a la Ciudad de Pilar, la misma cuenta con recepción final.

Proyecto	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	260			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	68.385.986	GS.	758.974.498.622
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
697.623.639.171	61.350.859.451		91,91 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
09/06/2015	26/11/2020		26/11/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caazapá, Itapúa			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,64 %			96,81 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
26.368.656.953	593.384.862		2,25 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

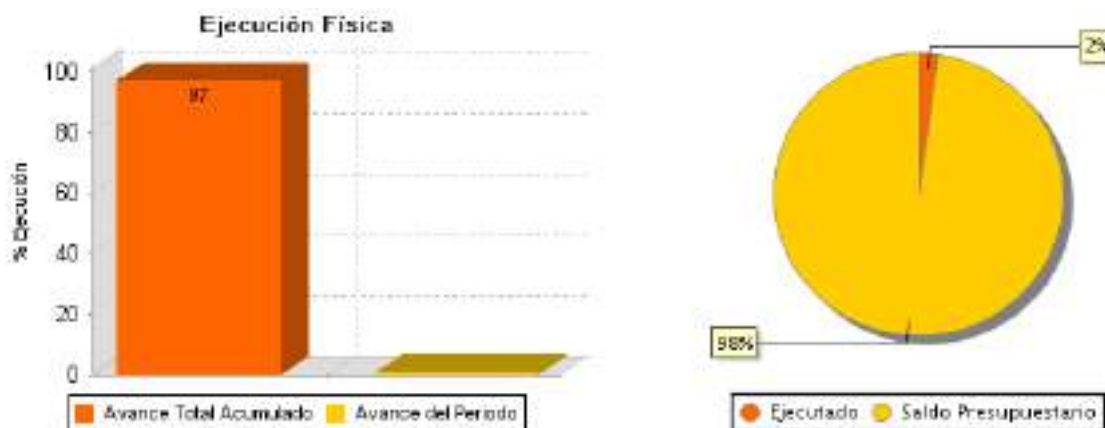


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Construcción del Centro Integral de Rehabilitación Social (CIRS) de Emboscada			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	273			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	49.800.000	GS.	278.880.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
170.010.920.096	108.869.079.904		60,96 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/02/2016	16/02/2018		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Central			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			89,75 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
10.603.443.253	947.050.969		8,93 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

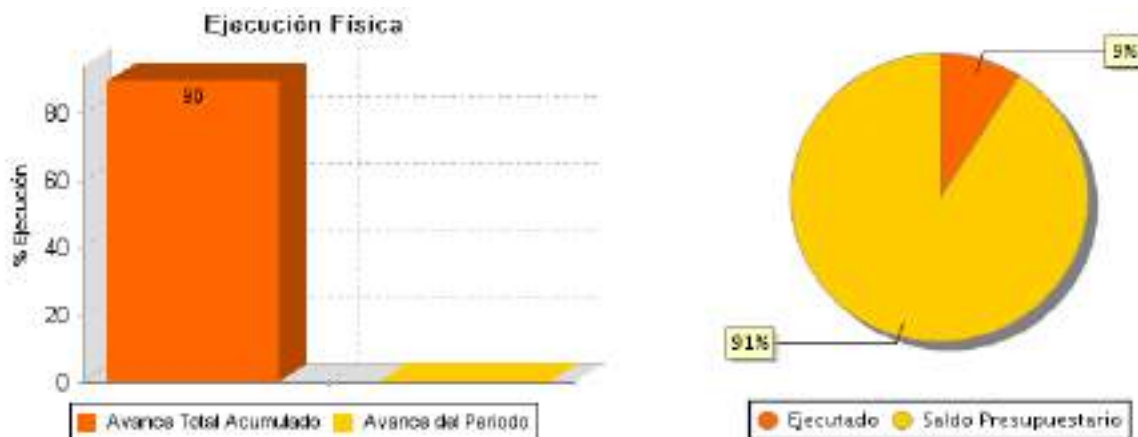


SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que el Complejo Penitenciario del Bloque A 1 se encuentra en etapa de Recepción Provisoria, mientras que del Bloque B 1 y 2 cuentan con recepción definitiva al término del primer cuatrimestre y se han realizado desembolsos para pago de deudas.

Proyecto	Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado de la Bahía Asunción		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	310		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	62.317.000	GS. 491.585.661.429
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
439.070.249.450	52.515.411.979	89,32 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
16/06/2016	23/06/2021	24/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Asunción		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		96,29 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
48.204.890.578	60.196.500	0,12 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

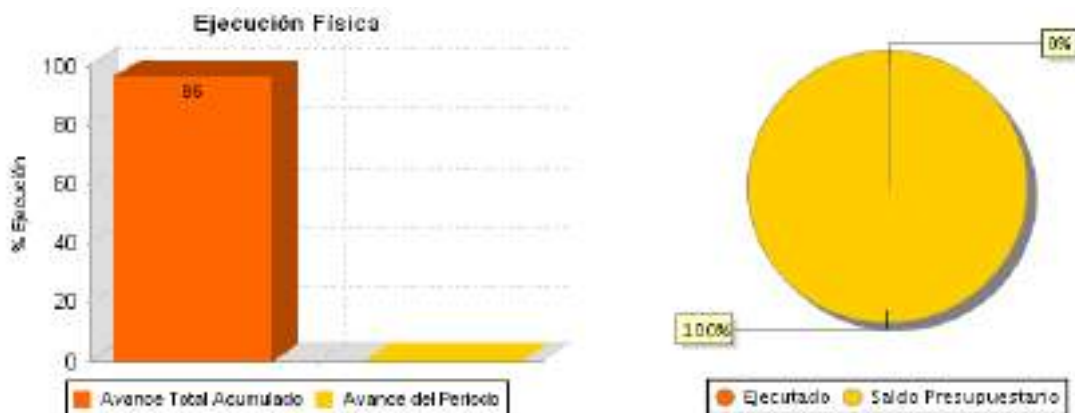


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del Proyecto han concluido. La PTAR de Bella Vista de Asunción cuenta con Recepción Definitiva y está en etapa de traspaso a la ESSAP.

Por otra parte, se encuentra en periodo de justificación del Ultimo Desembolso. El inconveniente principal es disponibilidad presupuestaria necesaria para realizar pagos de los contratos a fin de poder realizar las ultimas justificaciones de desembolso.

Proyecto	Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	311			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	48.120.000	GS.	312.293.363.651
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
273.156.113.689	39.137.249.962		87,47 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/06/2016	23/06/2021		24/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	San Lorenzo			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,24 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
47.566.754.835	8.434.783.994		17,73 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

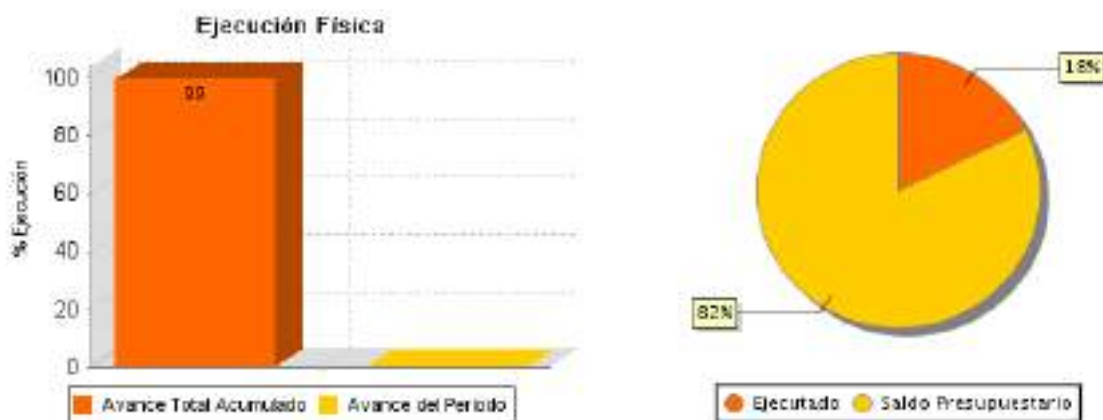


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto han culminado. Se encuentra en etapa de cierre; y el principal inconveniente por el cual atraviesa el proyecto es la realización de la última justificación de desembolso, debido a la falta de disponibilidad presupuesta, la cual se está gestionando para honrar con los compromisos.

Así mismo se informa que la PTAR de la Ciudad de San Lorenzo se encuentra en periodo de Mantenimiento y Operación y se tiene previsto su recepción definitiva en el mes de julio del presente ejercicio.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	329		
Financiamiento	BID , ICO		
Costo del Proyecto	USD	125.000.000	GS. 805.881.066.227
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
784.200.922.166	21.680.144.061	97,31 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
25/11/2015	25/11/2020	30/11/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
0,06 %	87,82 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
14.217.453.701	1.489.804.211	10,48 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

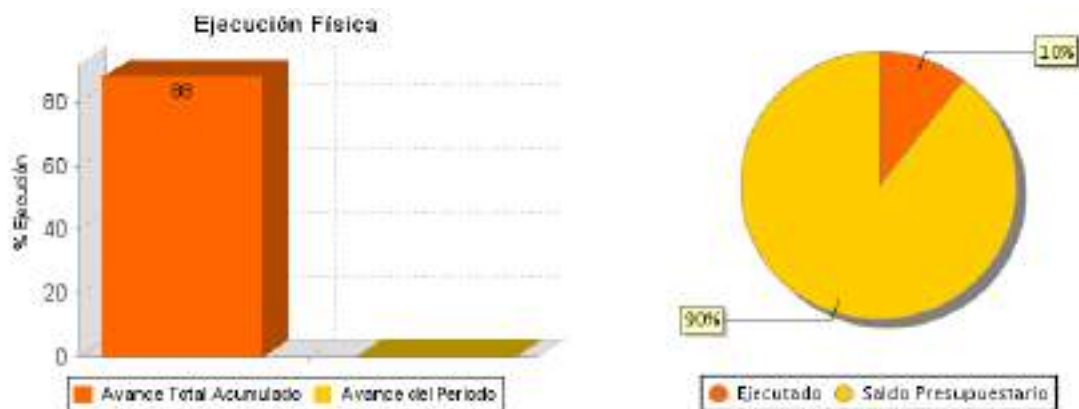


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del Primer Cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto, tanto para Caminos Rehabilitados, Puentes construidos ambas con sus Fiscalizaciones y Consultorías, se encuentran en proceso de finalización. Por otra parte, se informa que los procesos de contrataciones fueron ejecutados en su totalidad conforme al cronograma previsto.

Proyecto		Habilitación y Mantenimiento Ruta Nacional N° 9 y Acceso a Colonia Menonitas			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		383			
Financiamiento		BID , CAF, LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	670.386.143	GS.	4.688.049.304.307
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
4.012.940.787.004		675.108.517.303		85,60 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
18/09/2018		04/05/2026		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Boquerón, Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,71 %			88,82 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
321.983.592.126		126.620.028.188		39,32 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

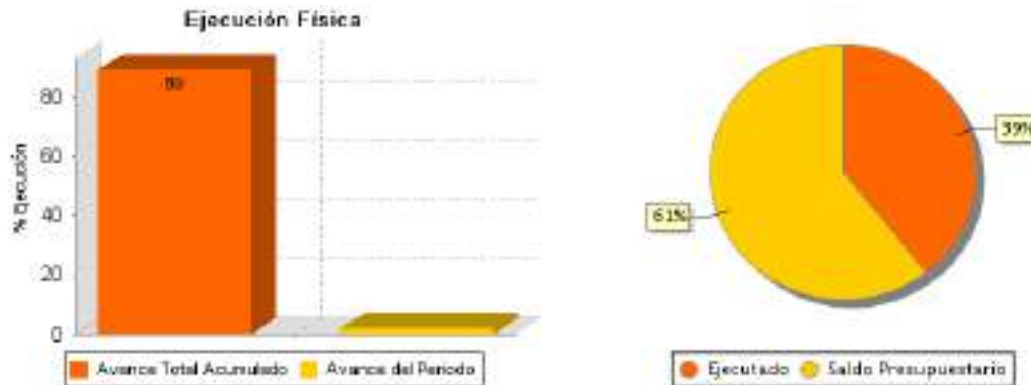


SITUACIÓN ACTUAL

El estado de las obras es el siguiente: Supervisión y Aprobación de los Certificados de Obras de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 y accesos: Tramo 1, Lote 1 (PROG. 50+000 a PROG. 112+000). tiene un avance físico de 98,93%, con una pavimentación asfáltica de 60 kilómetros., Lote 2 (PROG. 112+000 a PROG. 173+000), tiene un avance físico de 100% con una pavimentación asfáltica de 61 kilómetros, el Lote 2 se encuentra en la Etapa de recepción provisoria. Tramo 2, Lote 3 (PROG. 173+000 a PROG. 250+000). tiene un avance físico de 96,25% con una pavimentación asfáltica de 74 kilómetros, Lote 4 (PROG. 250+000 a PROG. 326+000). tiene un avance físico de 98,56% con una pavimentación asfáltica de 73 kilómetros. Tramo 3, Lote 5 (PROG. 326+000 a PROG. 390+000). tiene un avance físico de 100%, se encuentra en Etapa de Mantenimiento, Lote 6 (PROG. 390+000 a PROG 450+000), tiene un avance físico de 100%, se encuentra en Etapa de Mantenimiento. Tramo 4, Lote 7 (PROG. 450+000 a PROG. 525+000)., tiene un avance físico de 100% 8. Habilitación y Mantenimiento de la Ruta N° 9 y accesos, Lote 8 (Accesos), tiene un avance físico de 100%, se encuentra en la Etapa de Recepción Provisoria.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	384		
Financiamiento	CAF, FONPLATA		
Costo del Proyecto	USD	142.911.000	GS. 1.001.545.257.053
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
776.793.984.104	224.751.272.949	77,56 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
31/12/2018	31/12/2022	31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Amambay, Caazapá, Guairá, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
1,04 %	82,99 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
206.731.851.192	35.435.616.014	17,14 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

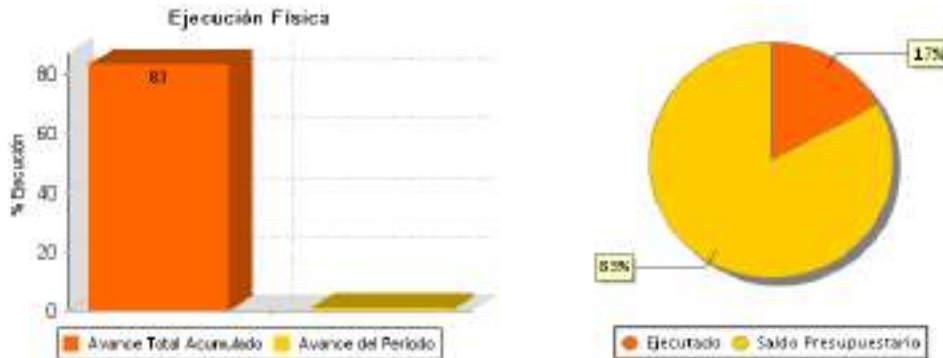

SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto comprende la Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales y Rurales, también la Construcción de Puentes de Hormigón Armado (H^ºA^º) en varios puntos de la Región Oriental. Actualmente en etapa de ejecución. A continuación se detalla los avances obtenidos en el primer cuatrimestre:


1. Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales; varias obras poseen Recepción Provisoria y Recepción Definitiva. El último contrato que se ejecuta en los Departamentos de Caazapá y Guairá tuvo un avance de 6.34 Km de caminos rehabilitados.

2. Construcción de Puentes de Hormigón Armado; varias obras se encuentran culminada y poseen Recepción Provisoria y otras con Recepción Definitiva. En cuanto a contratos en ejecución en varios departamento de la Región Oriental tiene un avance de 21,29 ml de puentes construidos al cabo del primer cuatrimestre.

Por otra parte, el servicio de consultoría para el apoyo técnico y fiduciario al proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental tiene un avance del 35%; El contrato de la Auditoría externa se encuentra en etapa de licitación.

Proyecto	Habilitación de la Red Vial Pavimentada en CORDILLERA, PARAGUARÍ, CAAGUAZÚ, GUAIRÁ, CAAZAPÁ			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	451			
Financiamiento	CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto	USD	201.878.982.976	GS.	593.091.656.828
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
528.678.559.050		64.413.097.778		89,14 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
04/01/2018		04/01/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caaguazú, Caazapá, Cordillera, Guairá, Paraguarí			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,54 %			83,86 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
58.622.148.974		13.683.964.444		23,34 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

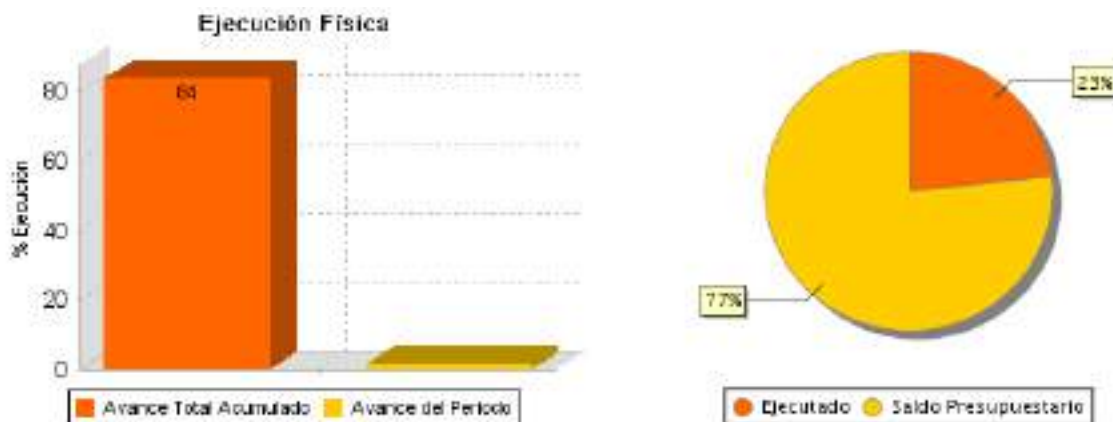


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto		Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Departamento de San Pedro			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		454			
Financiamiento		CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto		USD	34.157.721	GS.	251.942.708.325
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
187.277.954.287		64.664.754.038		74,33 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/01/2018		04/01/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,93 %			89,04 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
23.682.613.948		8.701.172.057		36,74 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

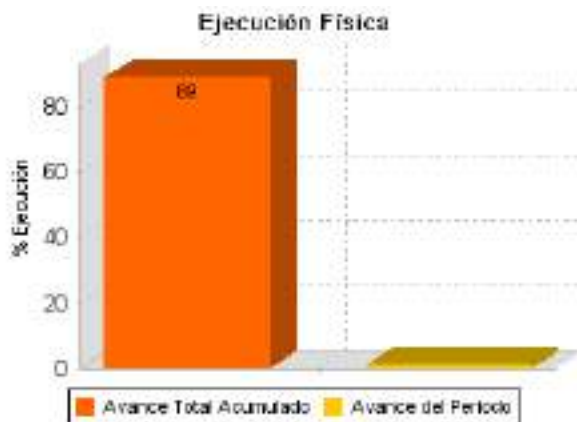


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Habilitación de la Red Vial Pavimentada Villeta - Alberdi			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	455			
Financiamiento	CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto	USD	31.889.950	GS.	189.562.926.102
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
153.993.715.055	35.569.211.047		81,24 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/01/2018	04/01/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2,00 %			86,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
10.608.576.888	2.935.903.201		27,67 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

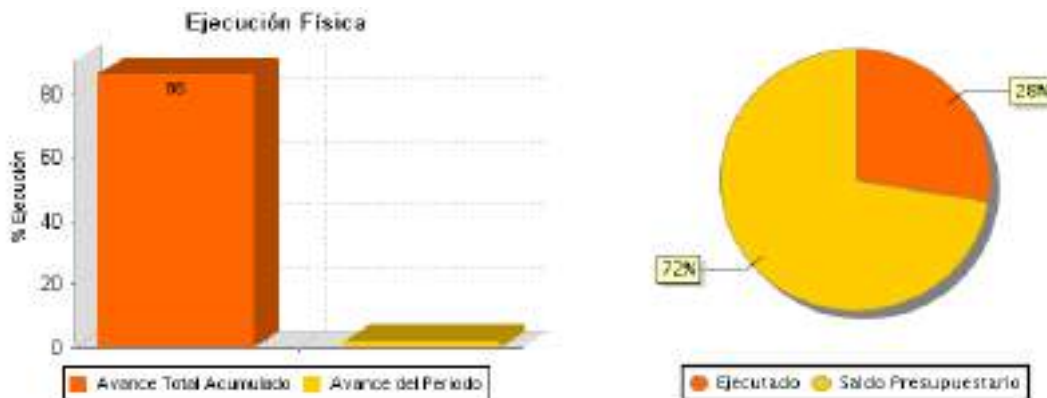


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre las obras que componen el SNIP 455 presenta los siguientes avances:

En cuanto a la Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicios (CREMA); se encuentra culminada la etapa de rehabilitación. Actualmente se encuentra en etapa de mantenimiento de 40 km de rutas pavimentadas con trabajos de limpieza de franja de dominio, sellado de fisuras y bacheo superficial.

Proyecto	Mejoramiento de 160 Km de Caminos Vecinales en la Región Oriental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	564		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	62.000.000	GS. 419.173.251.031
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
320.662.509.772	98.510.741.259	76,50 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
05/01/2018	05/01/2023	17/1/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
4,66 %	70,80 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
80.658.640.436	20.155.746.581	24,99 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

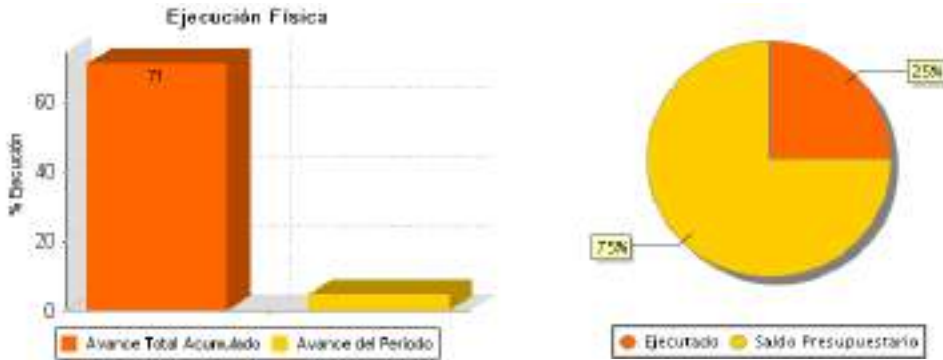

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de este Primer Cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto han avanzado conforme a lo planificado, tanto para el proyecto Caminos Rehabilitados y Puentes Construidos, ambas con sus Fiscalizaciones y Consultorías. A continuación se detalla los siguientes avances de las obras en ejecución:

- 1. Caminos Rehabilitados;** se registran un total de 5,79 km realizados de 21,08 km programados en varios departamentos de la Región Oriental.
- 2. Mantenimiento de Caminos Vecinales;** se ejecutaron 724,29,76 km de caminos programados en varios departamentos de la Región Oriental.
- 3; Construcción de Puentes de H°A°;** 13,63 ml de Puentes construidos de 72,22 ml programados en la Región Oriental, todos conforme a la meta física prevista dentro del periodo fiscal 2024.

Así también las empresas fiscalizadoras acompañan a cabalidad todo lo concerniente a las aprobaciones de las obras construidas. Cabe mencionar también que los certificados correspondientes a las consultorías se procesan con normalidad honrando el pago de acuerdo al V° B° de la Dirección de Caminos Vecinales. Por otra parte, se informa que los procesos de contrataciones dentro del proyecto siguen su curso conforme al cronograma previsto.

Proyecto	Habilitación de la Red Pavimentada Departamentos de San Pedro, Caaguazu y Canindeyu.			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	594			
Financiamiento	BIRF			
Costo del Proyecto	USD	53.057.700	GS.	411.614.354.995
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
143.609.127.148	268.005.227.847		34,89%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
05/01/2018	05/01/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caazapá, Canindeyú, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total		
4,10 %		42,58 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
94.522.452.792	26.771.148.314		28,32 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


La etapa de rehabilitación de Rutas pavimentada no han culminado se encuentra con problemas con la constructora para la ejecución normal de las obras, por lo tanto se encuentra muy retrasada las obras. Entre las intervenciones realizadas al cabo de éste cuatrimestre fueron las siguientes: Limpieza de franja de dominio, construcción de acceso a comunidad indígena, construcción de dársenas para control de peso, bacheo superficial, limpieza de franja y obstrucción del escurrimiento, materiales sueltos.

En cuanto al llamado a licitación de adquisición de chalecos reflectivos para campañas de seguridad vial concluyó con la adjudicación y firma del contrato al cabo del primer cuatrimestre.

También se procedió por segunda vez el proceso de Licitación para la adquisición de equipos educativos para campañas de seguridad vial, estado en convocatoria.

Proyecto	Habilitación de la Red Pavimentada Departamentos de Misiones e Itapúa		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	595		
Financiamiento	BIRF		
Costo del Proyecto	USD	46.540.241	GS. 383.046.126.088
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
187.275.190.582	195.770.935.506	48,89%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
05/01/2018	05/01/2025	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Itapúa, Misiones		
Avance Físico Reportado del Período	Avance Físico Acumulado Total		
2,23 %	60,24 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
71.505.414.522	11.123.712.009	15,56 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

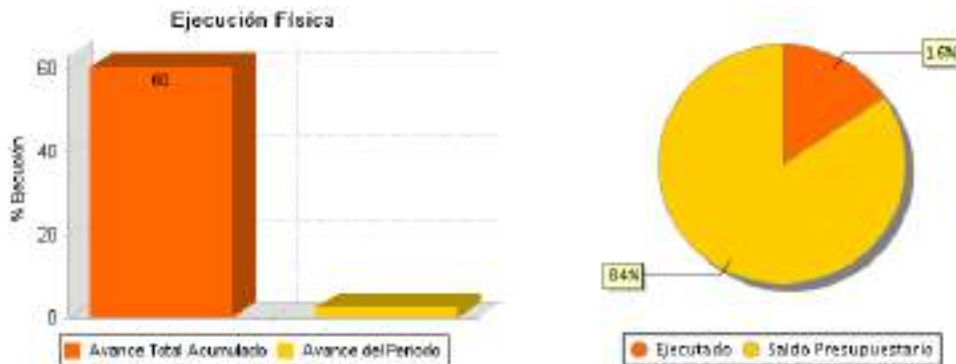

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de rehabilitación de la Ruta PY 1 ha culminado, actualmente en etapa de mantenimiento que se ejecuta a lo largo de la ruta. No presenta mayores retrasos. A continuación se detalla las siguientes intervenciones: reparación del desnivel entre banquina y talud, remoción de obstáculos en calzada, eliminación materiales sueltos y exceso de vegetación, pozos, entre otros.

El llamado a Licitación Pública Internacional para la Contratación de los Servicios de Consultoría de Implementación y operación del sistema de planificación y gestión vial a fin de completar el inventario vial, continua en etapa de evaluación.

La consultoría de Auditoría Financiera y Contable que se encuentra actualmente adjudicada y ejecutando, según la UEP no han cumplido con la presentación de informes correspondiente al periodo auditado 2023

Proyecto	Mejoramiento y Conservación tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta N° 6			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	646			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	48.747.500	GS.	342.424.871.123
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
288.984.231.770	53.440.639.353		84,39 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/11/2018	23/11/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caazapá, Guairá			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
3,65 %			83,57 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
32.471.551.502	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las Obras de Mejoramiento, Rehabilitación y posterior Mantenimiento del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme con la Ruta N° 6. se encuentra en etapa de mantenimiento, con un avance físico real de la Capa de Rodadura de 60 km. Las actividades realizadas en el periodo fueron, Limpieza de la Franja de Dominio y de los Drenajes, Bacheo en las calzadas rehabilitadas y la Operaciones de Bascula Móvil. Además, se continúa trabajando en los TDRs de los Servicios de Consultoría para el Plan de Gestión Ambiental. Se encuentra en ejecución la Consultoría de la ECATEF y el contrato de Pago de Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Viales.

Proyecto		Mejoramiento y Conservación tramo Caaguazu - Yhu. - Empalme Ruta N° 10		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		647		
Financiamiento		BID		
Costo del Proyecto	USD	6.994.000	GS.	52.153.436.228
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
36.799.074.843		15.354.361.385		70,56 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
23/11/2018		23/11/2024		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caaguazú, Canindeyú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2,00 %			92,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
6.570.702.616		705.831.288		10,74 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

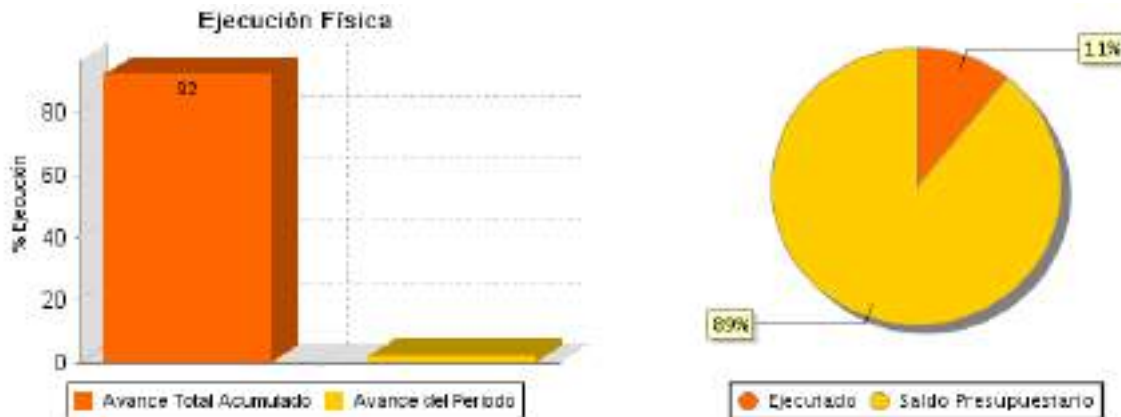

SITUACIÓN ACTUAL

La obra de mejoramiento y conservación por niveles de servicio de la Ruta N° 13, desde Caaguazú hasta el empalme con la Ruta N° 10, actualmente se encuentra en etapa de mantenimiento y los trabajos realizados en el periodo fueron. Limpieza de la Franja de Dominio y de los Drenajes, Bacheo en las calzadas rehabilitada, calzada existente y las Operaciones de Bascula Móvil.

Proyecto	Construcción Caminos Rurales no Pavimentados Region Oriental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	720		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 1.059.459.065.024
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.047.032.755.447	12.426.309.577		98,83 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
20.473.908.082	0	0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contrato de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto		Construcción de Pavimentación sobre mpedrados en Región Centro		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		722		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	296.215.158.010
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
254.671.517.592		41.543.640.418		85,98 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Central, Cordillera, Paraguari			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,10 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
1.543.640.418		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que no se registraron avances en el periodo de referencia debido a la falta de disponibilidad presupuestaria para honrar los compromisos pendientes (reajustes, intereses moratorios) que se encuentran enmarcados en los Decretos N° 4614/2020 y 9.543/2023. Al respecto, cabe mencionar que al cierre del primer cuatrimestre del año no cuenta con Plan Financiero a ejecutar.

Proyecto		Construcción Asfalto sobre Empedrado Región Sur		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		724		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	21.884.404.330
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
21.364.292.276		520.112.054		97,62 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Itapúa, Misiones, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,50 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
105.755.141		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

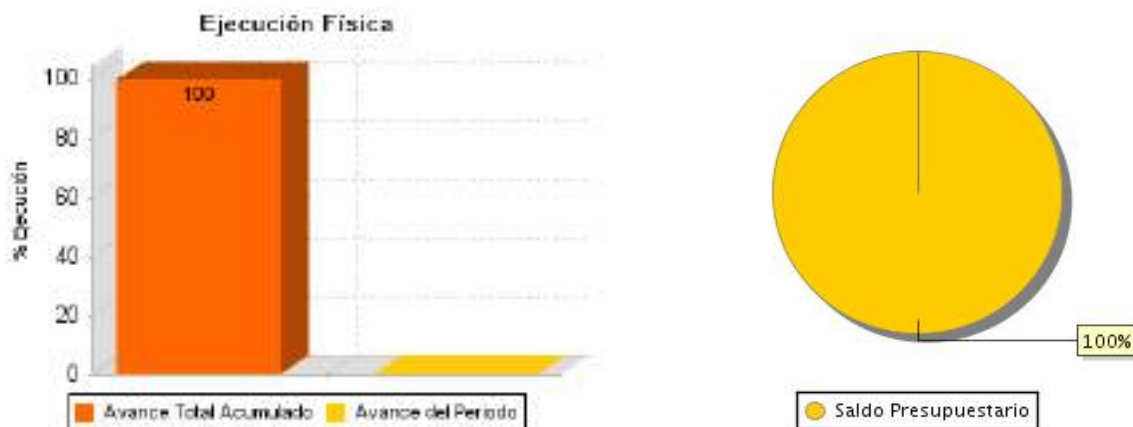


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto		Construcción de Pavimento sobre Empedrados en Región Este.		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		725		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	37.686.822.499
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
36.631.678.571		1.055.143.928		97,20%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			98,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
3.883.228.228		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

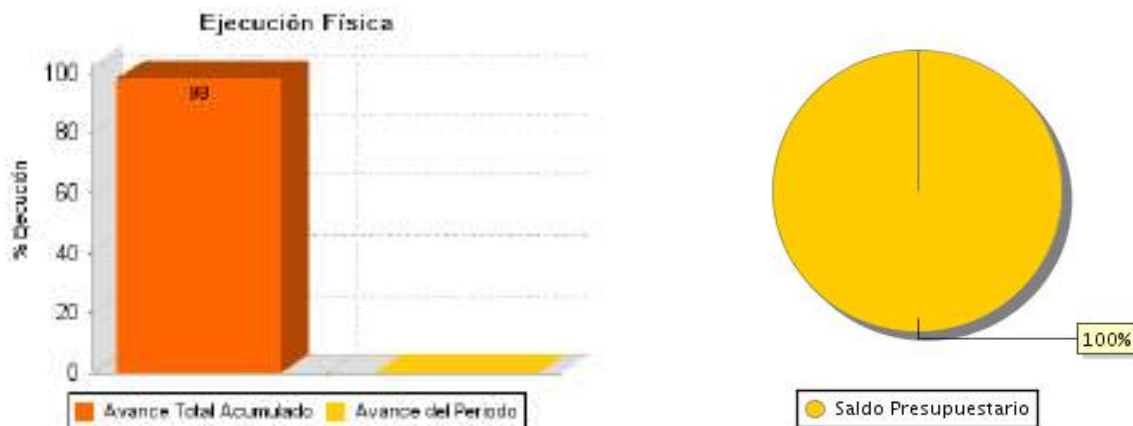


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyecto no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto		Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en REGION CENTRO			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		729			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	530.310.336.320
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
440.189.155.151		90.121.181.169		83,01 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central, Guairá, Paraguari				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			99,44 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
17.422.362.163		7.541.106.745		43,28 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

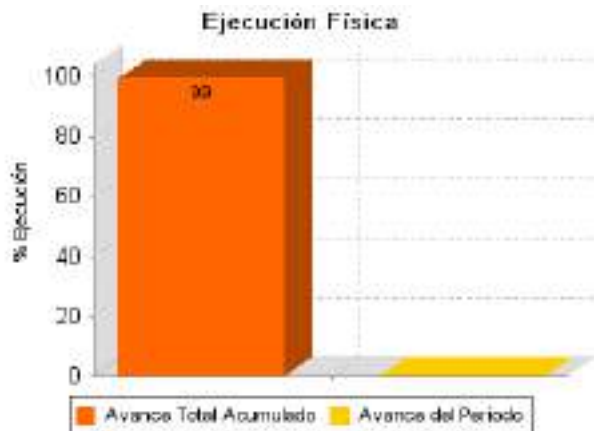


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Construcción y Pavimentada Asfáltica de Tramos Camineros en Región Este		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	730		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 161.967.754.975
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
160.887.188.373	1.080.566.602	99,33%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
01/01/2018	31/12/2020	31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %	98,80 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
704.596.698	0	0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contrato de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en Región Centro Sur		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	731		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 194.288.417.303
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
185.542.775.390	8.745.641.913		95,50 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Caazapá, Guairá, Itapúa		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		94,20 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
4.455.641.375	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

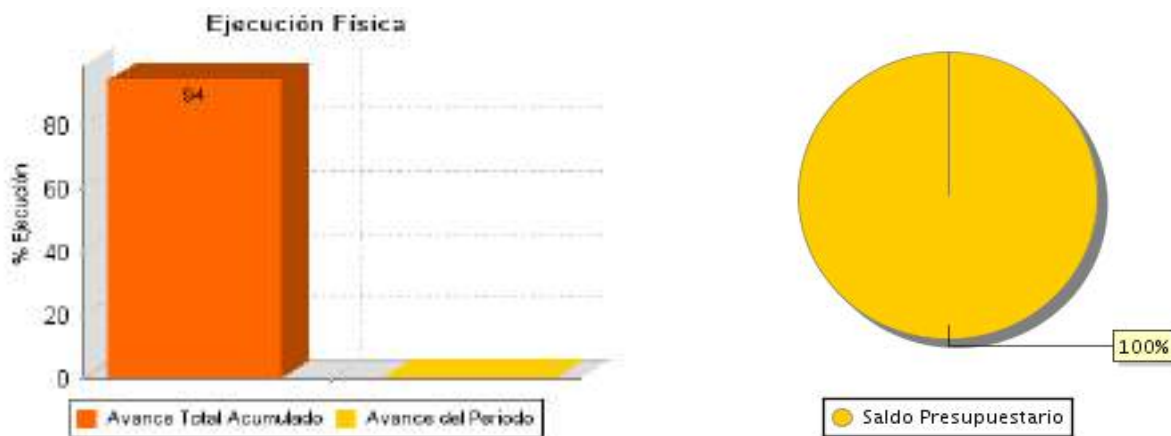

SITUACIÓN ACTUAL

No se registran avances debido a la falta de disponibilidad presupuestaria para el pago de compromisos pendientes (reajustes, intereses moratorios). Es importante mencionar que según reporte del SICO al final del primer cuatrimestre no cuenta con ejecución presupuestaria. Al respecto, el MOPC manifiesta que el Plan Financiero Vigente resulta insuficiente para el cumplimiento de los compromisos mencionados. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado dentro del Decreto N° 4770/2021.

Proyecto	Construcción y Pavimentada Asfáltica de Tramos Camineros en Región Noreste		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	732		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 385.410.314.167
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
268.615.685.907	116.794.628.260		69,70%
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Amambay, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Guairá		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		90,96 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
4.677.334.918	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción Pavimentacion tipo Empedrados y Puentes - Región Centro			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	736			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	28.060.365.090
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
26.214.560.425	1.845.804.665		93,42 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central, Cordillera, Guairá, Paraguari			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,36 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
3.180.254.770	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyecto no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Construcción Pavimentada Tipo Empedrados y Puentes - Región Sur			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	737			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	435.991.771.762
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
35.334.543.924	400.657.227.838		8,10%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			98,80 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
0	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

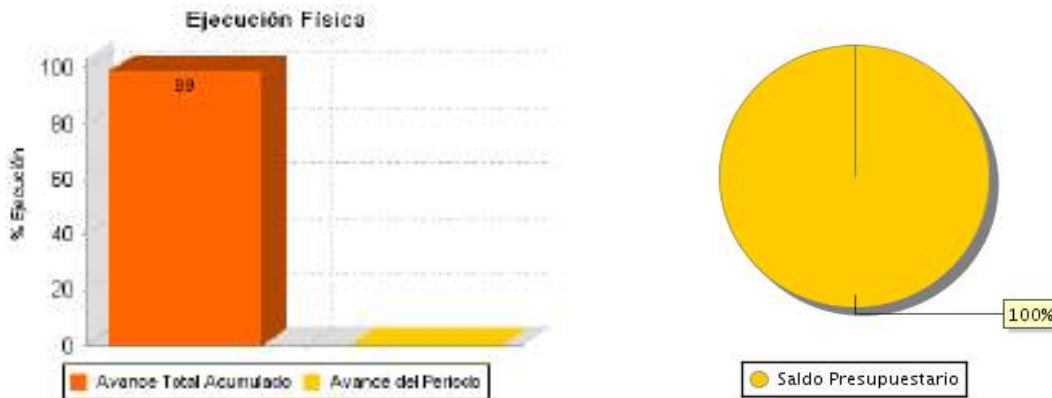


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de contrato de obra de construcción de puentes de hormigón armado, en concepto de reajuste de precios.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Conservación de rutas pavimentadas por administracion			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	746			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	178.839.008.464
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
177.671.766.399		1.167.242.065		99,35 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			76,59 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
9.953.171.547		3.027.536.362		30,42 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

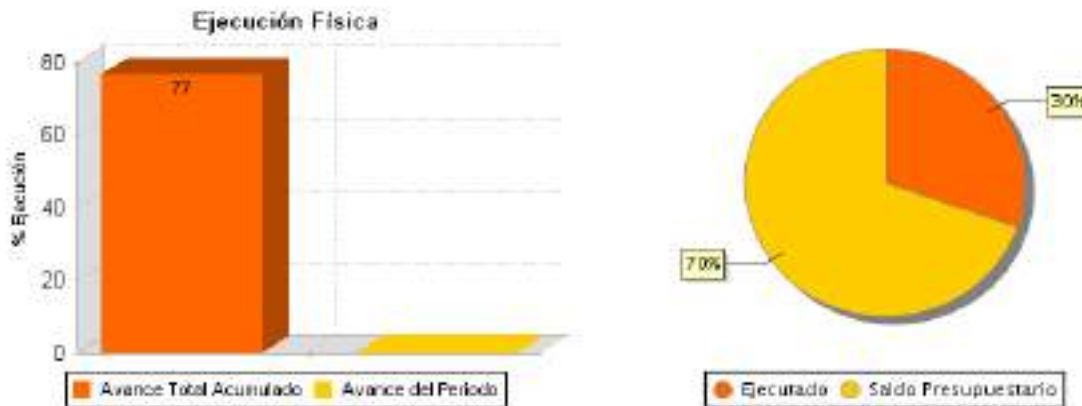

SITUACIÓN ACTUAL

En este primer cuatrimestre del año 2024, se realizaron pagos de facturas adeudadas a contratistas por la provisión de asfalto, en el marco al Llamado 32/2019 "Licitación Pública Nacional - Subasta a la baja electrónica para la Adquisición de Materiales para Plantas Asfálticas ubicadas en la Región Oriental. Se espera contar con recursos suficientes para saldar deudas por la provisión de productos bituminosos. También se encuentra en proceso la actualización de documentaciones como actualizaciones de póliza, facturas (timbrados vencidos), actualizaciones de los certificados de cumplimiento tributarios de la SET, informes técnicos de manera a procesar el pago de deudas pendientes según disponibilidad presupuestaria.-

Proyecto	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	758			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	193.600.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
20.239.610.647	173.360.389.353		10,45 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %		100,0 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
196.628.411	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto		Habilitación y Mantenimiento de la Ruta 1 tramo Carapegua - San Juan Bautista			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		760			
Financiamiento		CAF, FONPLATA, LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	53.501.521	GS.	280.884.636.738
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
186.586.642.334		94.297.994.404		66,43 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/01/2018		04/01/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Misiones, Paraguari				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,99 %			81,89 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
28.007.845.135		9.406.177.084		33,58 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

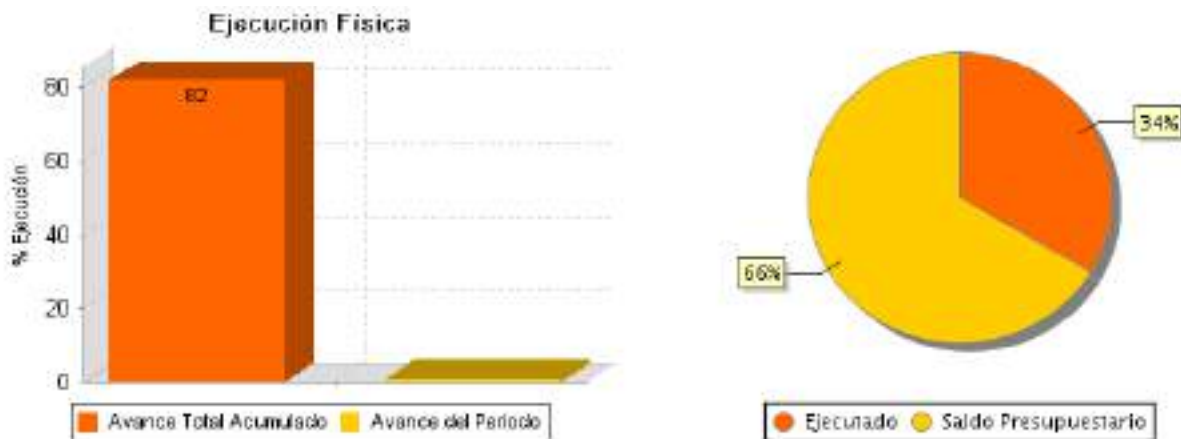


SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que las obras ejecutadas en este periodo fueron las de mantenimiento de los elementos de la carretera y Limpieza de la Franja de Dominio con tractores con rotativa y personal con desmalezadora. Cabe mencionar que las obras de puesta en punto finalizaron y actualmente se encuentra en Fase de Mantenimiento..

Proyecto	Construcción y mantenimiento Ruta Nº 3 tramo km 21.8-170.3			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	761			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	378.545.281.810
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
107.073.306.908	271.471.974.902		28,29%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central, Cordillera, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
33.005.350.720	3.846.261.572		11,65 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

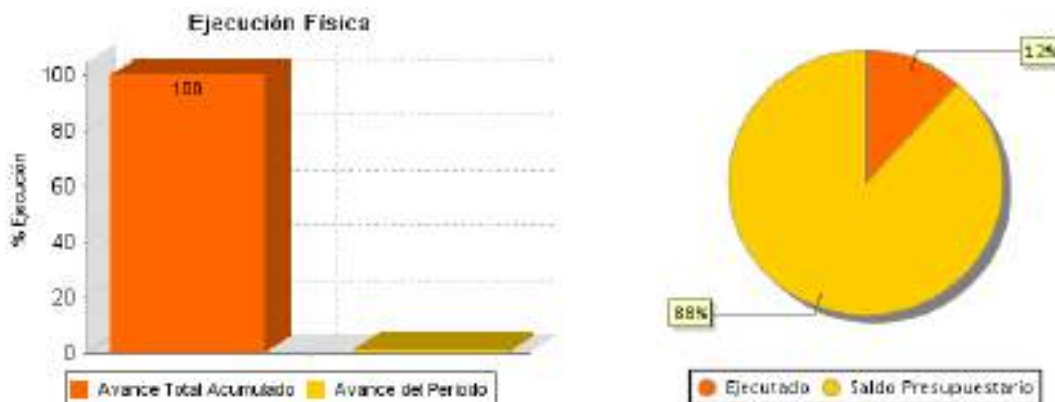

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto		Construcción y mantenimiento Ruta N° 4 tramo km 225 - 358.4		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		762		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 403.343.600.758
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
116.952.790.835		286.390.809.923		29,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Misiones, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
35.114.637.349		205.670.304		0,59 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	764		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 194.800.960.023
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
191.878.397.930	2.922.562.093		98,50%
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
2.186.293.317	225.479.368		10,31 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

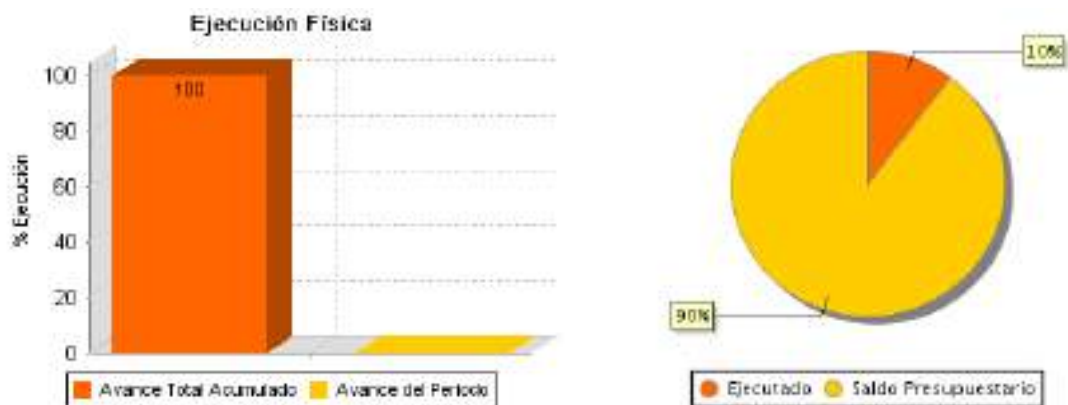


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Conservación Caminos Rurales no Pavimentada Región Oriental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	766		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 273.331.128.503
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
266.127.690.303	7.203.438.200		97,36%
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
5.267.147.967	544.874.336		10,34 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

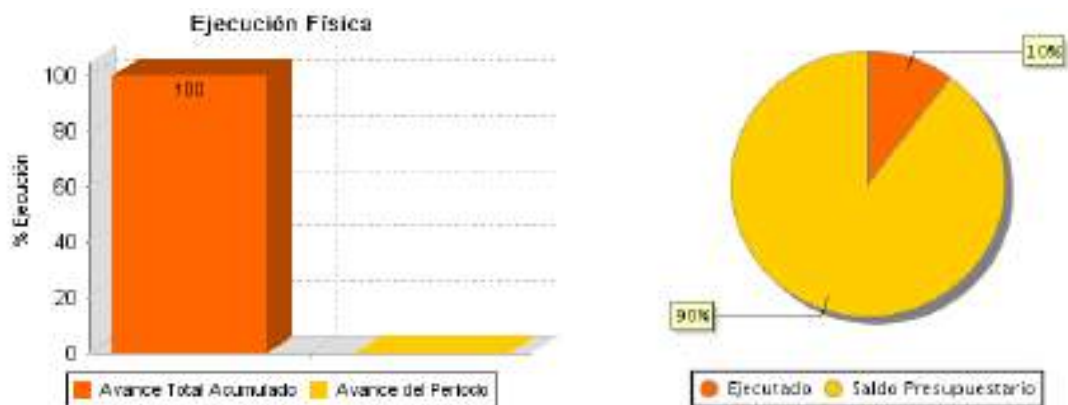


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Mejoramiento Tramo Pedro Juan Caballero - Capitan Bado - Ypejhu		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	796		
Financiamiento	FONPLATA		
Costo del Proyecto	USD	220.000.000	GS. 1.638.315.800.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
0	1.638.315.800.000	0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
12/9/2023	N/A	31/12/2028	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Amambay, Canindeyú		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
0,96 %	1,92 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
100.857.993.548	0	0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

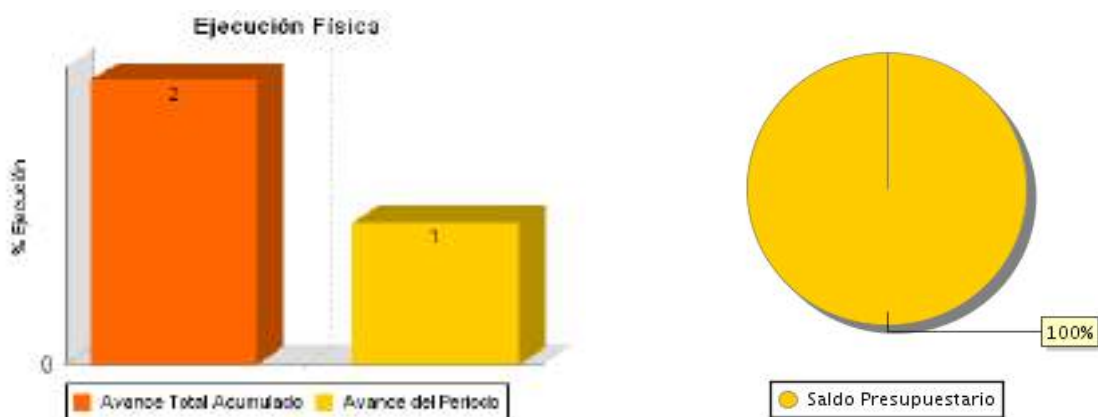


SITUACIÓN ACTUAL

Es un proyecto nuevo, en setiembre del 2023 obtuvo su ratificación parlamentaria. Al cabo del primer cuatrimestre, la obra se encuentra en proceso de licitación, específicamente en etapa de evaluación, también la fiscalización. Se prevé en el próximo cuatrimestre se adjudique la obra.

Proyecto	Construcción de 1500 viviendas en el Bañado Sur			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	797			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	100.000.000	GS.	551.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
27.643.205.388	523.356.794.612		5,02 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/11/2019	11/11/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Asunción			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total		
0,43 %		7,65 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
34.043.679.896	2.888.472.813		8,48 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

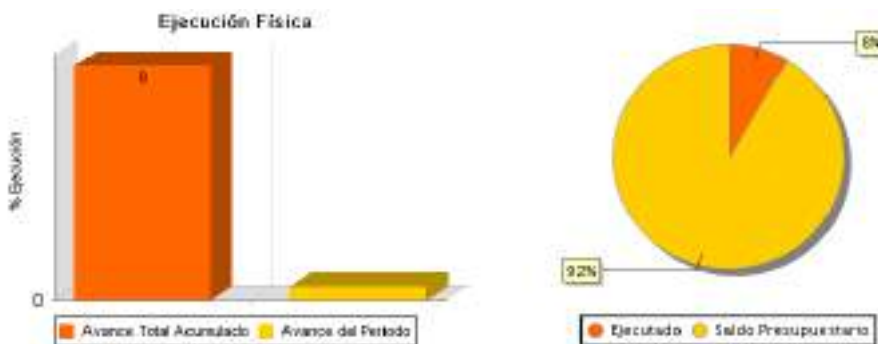


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se han obtenido los siguientes avances en el marco de los productos de Consultorías en ejecución:

- Desarrollo del Master Plan y Diseño Ejecutivo de Infraestructura Urbana: La firma consultora ha entregado el Producto N° 3 – Anteproyecto. Se han remitido desde la UEP las observaciones a ser subsanadas para el avance del Proyecto N° 4 – Proyecto Ejecutivo.
- Estudios de Saneamiento de la Laguna Yrupé y recuperación de Zonas naturales de amortiguamiento, y Elaboración de Diseño ejecutivo y permisos de Infraestructura para construcción de parque lineal Yrupé: Durante el año 2024, la firma ha presentado el Producto N° 3 Alternativas, el cual se encuentra en análisis y se ha instalado una mesa de conflicto en la que se está tratando las divergencias en cuanto al Producto.
- Proyecto Ejecutivo de viviendas sociales sostenibles: Se aprobó el Producto N° 2 - Estudios Preliminares. El Consorcio ha presentado el Producto N° 3, el cual se encuentra en proceso de revisión y ajustes. Apoyo técnico y logístico a las acciones sociales del Programa. Acompañamiento a las familias beneficiarias, en el marco del Plan de Reasentamiento Temporal.
- Diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación del Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur de Asunción (Barrio Tacumbú) Coberturas de prensa y elaboración de Gacetillas. Supervisión y aprobación de los posteos en las redes. Co-producción y supervisión de guión y acompañamiento del Bloque del PRVBT en el Programa de radio.

Proyecto	Capacitación y Mejoramiento en Formulación y Ejecución de Proyectos de la DIPE		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	798		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 138.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
34.366.191.391	103.633.808.609		24,90%
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
22/11/2018	22/11/2023		22/11/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,27 %		99,37 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
5.601.979.826	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

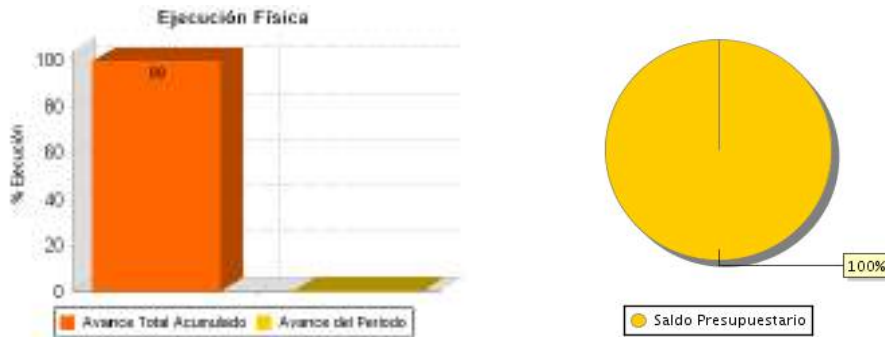

SITUACIÓN ACTUAL

Durante el primer cuatrimestre, en el marco del Convenio de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura, se ha llevado a cabo una colaboración para fortalecer las capacidades técnicas y operativas del MOPC. Como parte de este proceso, se ha realizado la contratación de profesionales especializados en las distintas áreas conforme a requerimientos de los procesos de Estructuración de Proyectos estratégicos a cargo de la DIPE, lo cual incluye el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la Ruta PY 01 en el tramo Cuatro Mojones-Quiindy (108 km), Proyecto de rehabilitación y Pavimentación de la Ruta PY10 Tramo San Cristobal - Paso Yobai, a ser desarrollado por la modalidad de llave en mano, Proyecto de Equipamiento y Puesta en marcha de las Oficinas de Gobierno y mejoramiento del Puerto de Asunción, Mejoramiento de la Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, Proyecto de Mejoramiento y Modernización del Aeropuerto Internacional de Silvio Pettirossi y el Proyecto de Construcción e implementación del Tren de Cercanía entre Asunción e Ypacarai.

Asi mismo, para el Proyecto Ampliación y Mejoramiento Ruta PY01 en el tramo Cuatro Mojones-Quiindy 108 Km se ha logrado el hito en cuanto al Proceso de diálogo Competitivo iniciado entre 5 los precalificados.o entrega a los participantes del borrador del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y el borrador del Contrato PPP. Para el Proyecto Modernización y Ampliación del Aeropuerto Silvio Pettirossi se ha realizado la elaboración de las especificaciones técnicas para los estudios de estructuración del Proyecto.

Proyecto	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	806		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 827.729.290.861
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
584.479.175.481	243.250.115.380		70,61 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
24/05/2019	24/05/2023		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,83 %		73,66 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
151.518.370.429	12.707.391.087		8,39 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


Las actividades de éste proyecto se encuentran en ejecución. A continuación se detalla el avance obtenido al cabo del primer cuatrimestre:

1. Se realizó el llamado para Adquisición de Elementos Prefabricados de Hormigon Armado, así como la Adquisición de Cemento para mantenimiento de obras viales;
2. Para la Construcción de Puentes y Obras de Arte; se encuentran en etapa de elaboración de los proyectos ejecutivos de puentes mixtos a construir.
3. Se registraron avances y pagos de Contratos de Adquisición de baterías, mantenimientos menores, mayores de maquinarias, provisión de combustibles y lubricantes.

Por otra parte, se realizaron pagos de viáticos por trabajos de supervisión de obras administradas por la Dirección de Caminos Vecinales, con financiación de recursos locales.

Proyecto	Mejoramiento Intersección Tres Bocas			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	807			
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA			
Costo del Proyecto	USD	24.096.276	GS.	181.858.228.583
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
173.103.244.760	8.754.983.823		95,19 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
26/12/2018	26/12/2021		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Fernando de la Mora, San Lorenzo, Villa Elisa			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,34 %			98,58 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
11.319.791.762	5.320.315.400		47,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

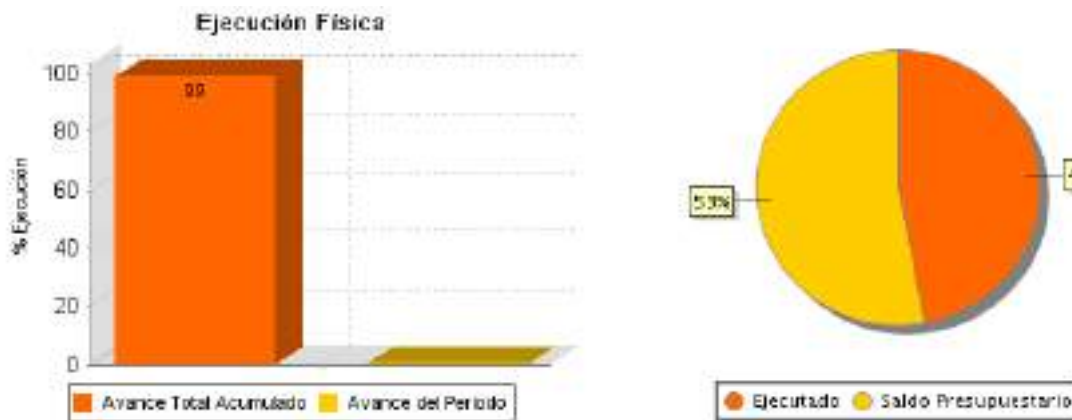


SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo de éste cuatrimestre los trabajos del paso a desnivel sobre Acceso Sur se han ejecutado en su totalidad, se aclara que la misma ha concluido. Queda pendiente pagos de certificados de obras, reajustes, adendas e indemnizaciones a frentistas.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	815		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 180.955.638.079
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
166.051.829.391	14.903.808.688		91,76 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/07/2019	31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	San Pedro		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		89,88 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
2.592.413.979	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

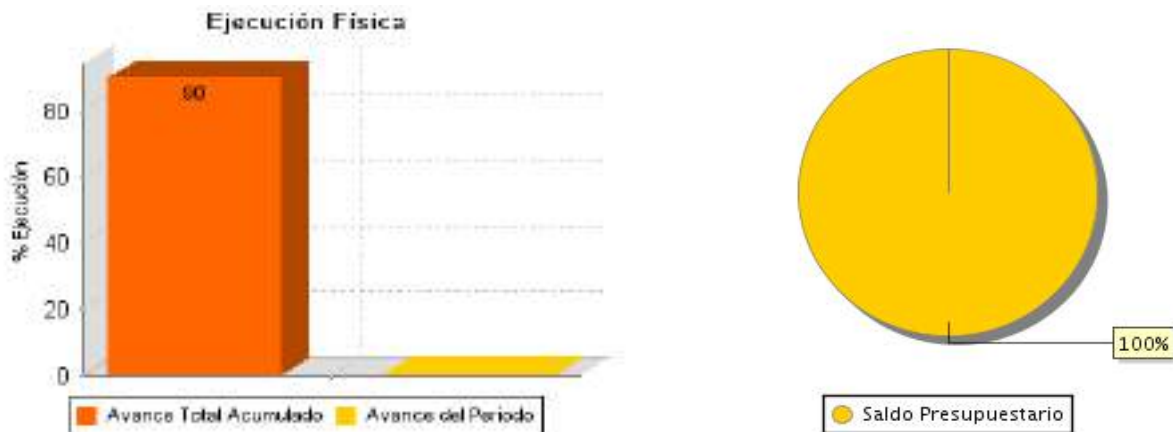


SITUACIÓN ACTUAL

Al momento del cierre del presente informe el MOPC no ha remitido respuesta a la observación realizada en el Banco de Proyectos de indicar el motivo por el cual no presenta ejecución presupuestaria atendiendo que cuenta con recursos en el Plan Financiero según reporte del SICO al cierre del mes de abril. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9.543/2023.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Alto Parana		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		817		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 146.006.682.452
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
145.194.761.116		811921336		99,44 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			85,72 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
59.819.669		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

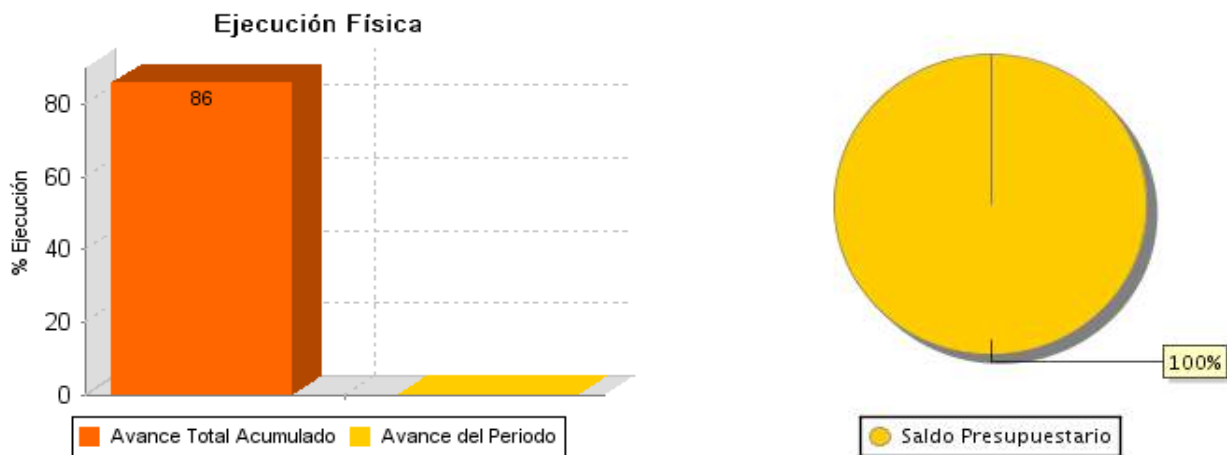


SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta en el presente periodo que no se registran avances en referencia al pago de deudas, indicando que si bien se cuenta con presupuesto vigente al cierre del mes de abril, es insuficiente para honrar las deudas activas. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	818			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	120.199.268.503
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
116.439.555.126	3.759.713.377		96,87 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019	31/12/2020		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Misiones			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			79,20 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
726.597.532	53.330.580		7,34 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

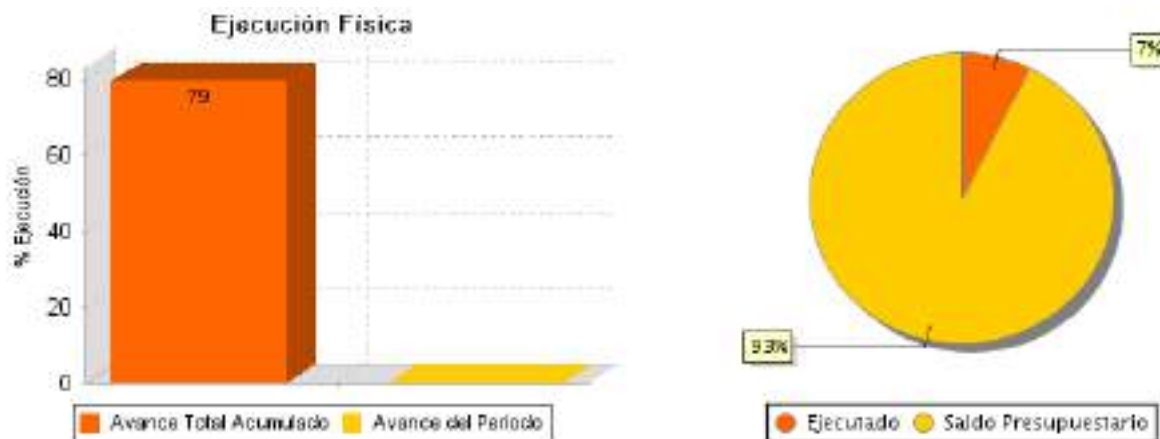


SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que en el periodo de referencia se ha registrado pago de certificados por deudas correspondientes a las obras Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental, 6ª Tanda – Lote N° 4: Santa María - Santa Rosa. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		820			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	154.593.491.989
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
149.755.324.196		4.838.167.793		96,87 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Cordillera				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			77,40 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
30		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

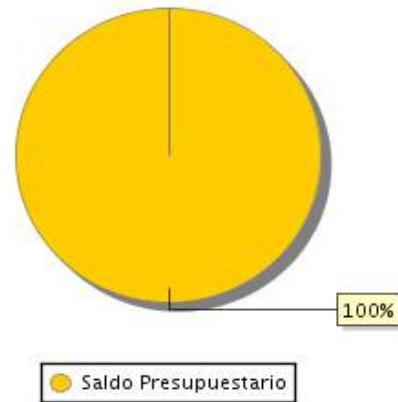

SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta en el presente periodo que no se registran avances en referencia al pago de deudas, debido a que no se cuenta con apertura presupuestaria. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	821			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	181.981.991.824
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
178.207.726.045	3.774.265.779		97,93 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019	31/12/2020		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			97,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
1.704.053.101	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El el periodo de referencia el MOPC reporta que no se registran avances en referencia al pago de deudas. Cabe mencionar que según reporte del SICO cuenta con recursos en el Plan Financiero, al respecto el MOPC manifiesta que el presupuesto es insuficiente para el pago de las deudas. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Decretos N° 4614/20 y 9543/2023

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyu		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		822		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 110.267.520.130
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
65.399.517.724		44.868.002.406		59,31 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/07/2019		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Canindeyú			
Avance Físico Reportado del Período			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
24.121.947.715		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

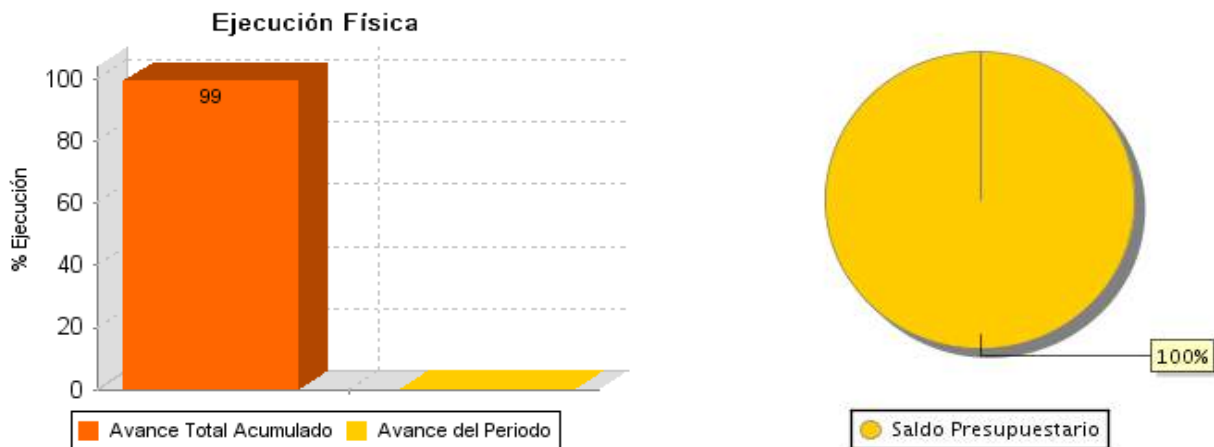


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC reporta que se encuentra en proceso administrativo el acta de liquidación de la obra. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Decretos N° 4614/20 y 9543/2023

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazu		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		825		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 233.581.015.840
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
221.287.863.716		12.293.152.124		94,74 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/07/2019		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caaguazú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			71,05 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
17.824.843.923		830.292.453		4,66 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

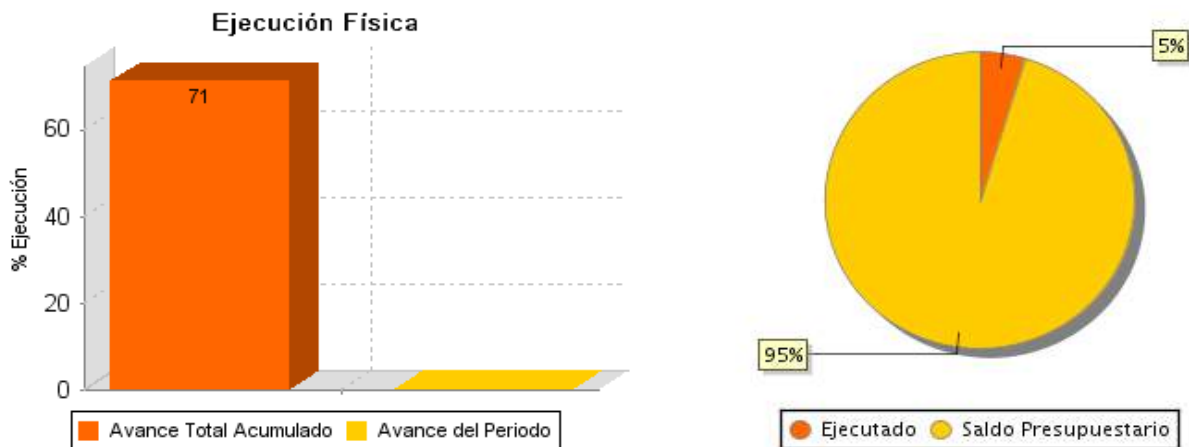


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia se reporta que se ha registrado pago de certificados correspondientes a las obras de Pavimentación Asfáltica de varios tramos de la Región Oriental, 6ª Tanda – Lote N° 1: San José de los Arroyos - Tebicuary. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Concepcion		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		826		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 56.605.555.891
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
53.423.418.873		3.182.137.018		94,38 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Concepción			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			92,50 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
9.857.865.966		5.629.495.552		57,11 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

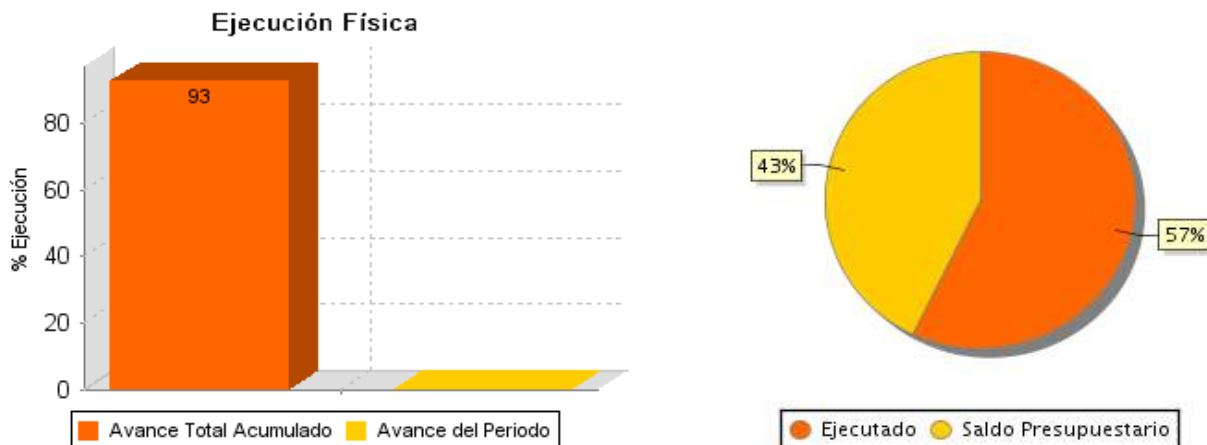


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia se reporta que se ha registrado pago de certificados correspondientes a las obras de Pavimentación Asfáltica de varios tramos de la Región Oriental 5ª Tanda – Lote N° 3: Ruta Nacional N° 5 Jhuguá Ocampos - Ykua Jhovv - San Blas. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023

Proyecto	Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 km)			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	857			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	99.100.000	GS.	633.712.360.978
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
74.601.908.648	559.110.452.330		11,77 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/04/2022	03/03/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
5,10 %			15,06 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
157.105.263.286	9.007.505.797		5,73 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

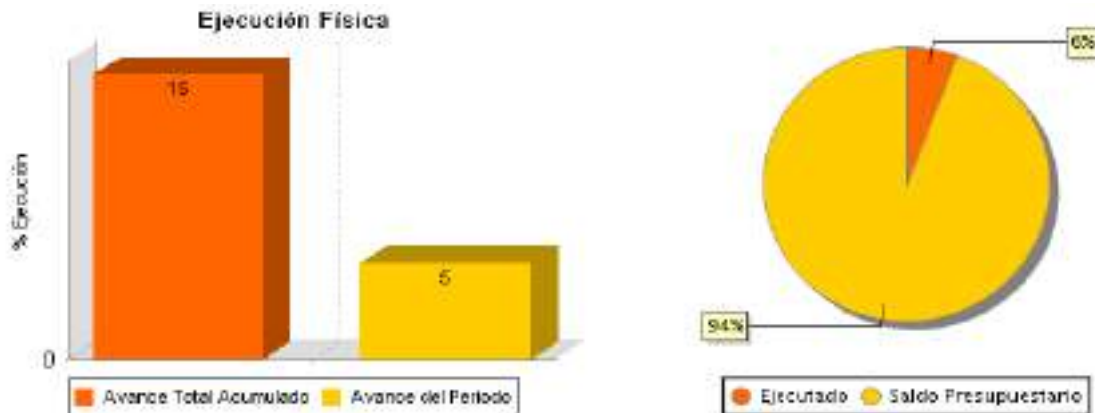

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se registraron los siguientes avances: Componente 1: Obras Civiles: Actividad 1: Construcción y Mantenimiento de la Ruta PY 21, Tramo: Ruta PY 07 (Empalme Supercarretera) - Puerto Indio, en los Lotes N° 1 y 2, presenta 7% de avance general, no registrando todavía avances en la capa asfáltica, se resaltan los trabajos de terraplén y excavaciones varias. Actividad 2: Obras Complementarias, en etapa de elaboración del PBC. Componente 2: Gestión Socio Ambiental: las actividades de este Componente no registran avances, se encuentra en etapa de adjudicación. Componente 3: Gestión del Proyecto: Actividad 2 - Fiscalización de las obras de Pavimentación y Mantenimiento de la Ruta PY 21, Tramo: Ruta PY 07 (Empalme Supercarretera) - Puerto Indio, las fiscalizadoras presentaron 3 informes mensuales en el presente cuatrimestre, las demás actividades no presentan avances.

Proyecto		Ampliación Defensa Costera Ciudad de Pilar			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		860			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	759.815.980.019
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
701.438.488.521		58.377.491.498		92,32 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
08/08/2019		08/08/2023		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Pilar				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			95,76 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
53.720.440.165		4.769.140.042		8,88 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre del año 2024, el MOPC reporta que los trabajos correspondientes a la primera fase del proyecto, se encuentran con recepción provisoria de obras, como así también se reporta el comienzo de la etapa de operación de mantenimiento.

Proyecto	Mejoramiento Corredor Agroindustrial Región Occidental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	863		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	134.342.866	GS. 1.288.128.933.825
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
873.373.458.429	414.755.475.396	67,80 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
23/12/2020	23/12/2027	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Boquerón, Presidente Hayes		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
7,41 %	60,79 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
236.883.925.138	101.560.608.140	42,87 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

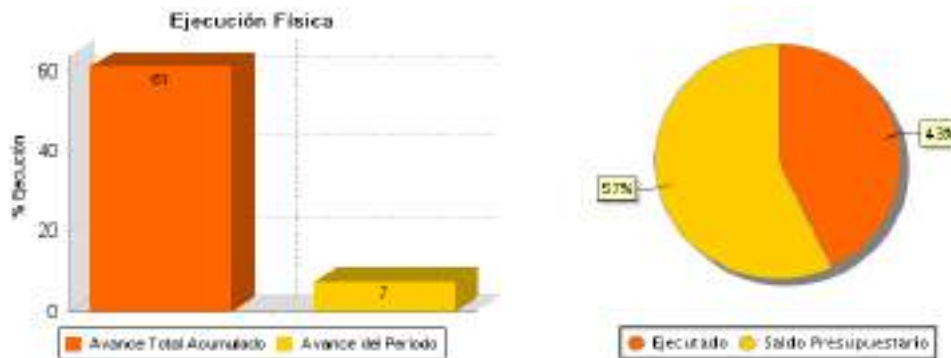

SITUACIÓN ACTUAL

Proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Agroindustrial de la Región Occidental, a continuación, detallamos el avance:

Componente 1 - Obras de Mantenimiento y Pavimentación Asfáltica: 1) Lote 1 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400 incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita (64,76Km), tiene un avance acumulado real de 93,24%, Los Ítems de obra trabajado son; Obras básicas (terraplén, Excavación no Clasificada), Desagües, Drenajes y Pavimentación; 2) Lote 2 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 48+400 incluido el tramo Paratodo – Cruce Douglas desde progresiva 0+000 hasta progresiva 5+100, el acceso a Campo Aceval y el tramo Campo Aceval - Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 0+000 hasta progresiva 29+500 (71,47 Km), tiene un avance real de 90,69%, Los Ítems de obra trabajado son; Obras básicas (terraplén, Excavación no Clasificada), Desagües y Drenajes, Interferencias, Obras Complementarias, Instalaciones y Pavimentación Asfáltica.

Componente 2 - Construcciones y Mantenimiento de Obras Basicas; Tramo Paratodo – Cruce Douglas desde Progresiva 5+100, y Tramo Campo Aceval – Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 29+500, tiene un avance real de 100%. Los Ítems de obra trabajado son; Obras básicas (terraplén, Excavación no Clasificada), Desagües, Drenajes, Obras Complementarias y pavimentación Asfáltica.

Los contratos de las Fiscalizaciones de obras se encuentran ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental.

Proyecto		Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Agroindustrial Region Oriental			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		864			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	100.657.134	GS.	685.804.896.001
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
233.724.587.273		452.080.308.728		34,08 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/12/2020		23/12/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
9,92 %			70,72 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
206.906.324.047		33.312.280.958		16,10 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Agroindustrial de la Región Oriental a continuación detallamos el avance: 1. Lote 1: Villa del Rosario - Volendam - San Pablo (Incluye Accesos a Volendam (4 Km Zona Urbana) y Puerto Mbopicua (6 Km) y Volendam San Pablo (hasta la cabecera sur del puente sobre el Rio Jejui e incluye mejoramiento acceso a San Pablo) (77,9 Km).cuenta con un Avance Físico Real del 50,85% - 2. Lote 2: San Pablo - Empalme PY 11 (Cruce Yacaré Ñe'e). tiene un Avance Físico Real 44,95% y. 3. Los contratos de las Fiscalizaciones de obras se encuentran ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental.

Proyecto	Construcción de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales / Sistema de Agua San Ignacio			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	871			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	13.364.200	GS.	99.394.366.512
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0	99.394.366.512		0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
07/07/2023	07/07/2023		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Misiones			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			0,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
12.500.000.000	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

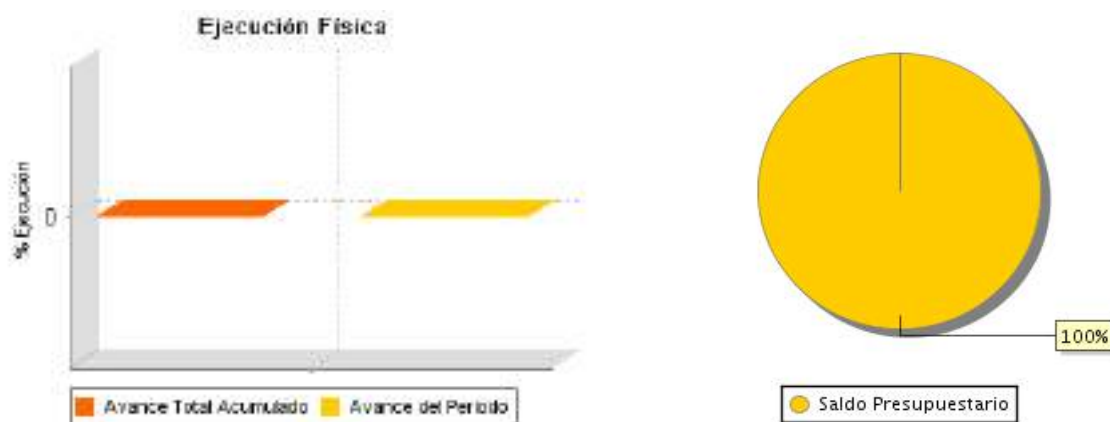


SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del primer cuatrimestre se ha elaborado el borrador de PBC de las obras Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para la ciudad de San Ignacio, que se encuentra en proceso de revisión en la UOC del MOPC y cumpliendo con todos los requisitos para su publicación en el portal de la DNCP. Se espera dentro del segundo cuatrimestre publicar dicho llamado.

Proyecto	Construcción Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Agua Residuales / Sistema de Agua Santa Rita			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	874			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	15.952.010	GS.	118.640.841.094
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0	118.640.841.094		0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
07/07/2023	07/07/2023		31/12/2027	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %		0,00 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
12.500.000.000	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

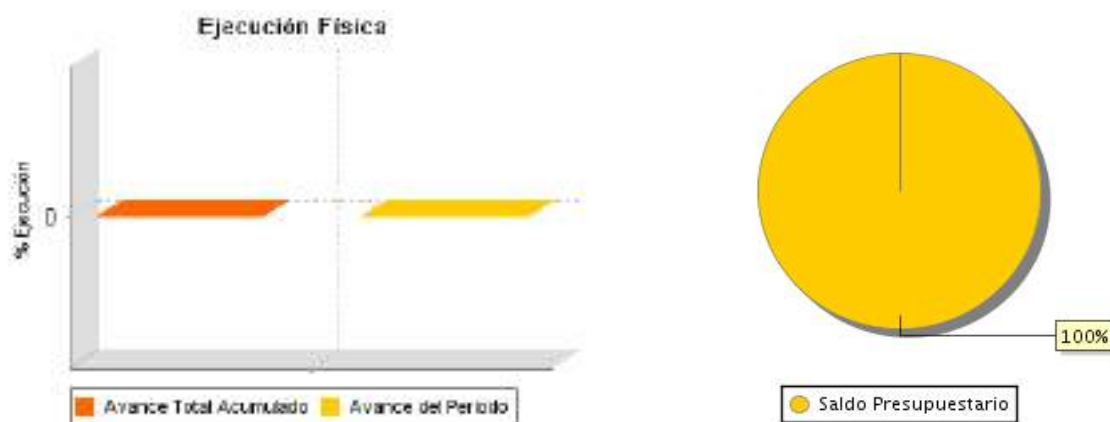


SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del primer cuatrimestre se ha elaborado el borrador de PBC de las obras Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para la ciudad de Santa Rita, que se encuentra en proceso de revisión en la UOC del MOPC y cumpliendo con todos los requisitos para su publicación en el portal de la DNCP. Se espera dentro del segundo cuatrimestre publicar dicho llamado.

Proyecto	Construcción Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales / Sistema de Agua Carapeguá			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	875			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	13.089.763	GS.	97.353.279.746
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0,00	97.353.279.746		0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
07/07/2023	07/07/2023		31/12/2027	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Paraguay			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			0,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
12.500.000.000	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

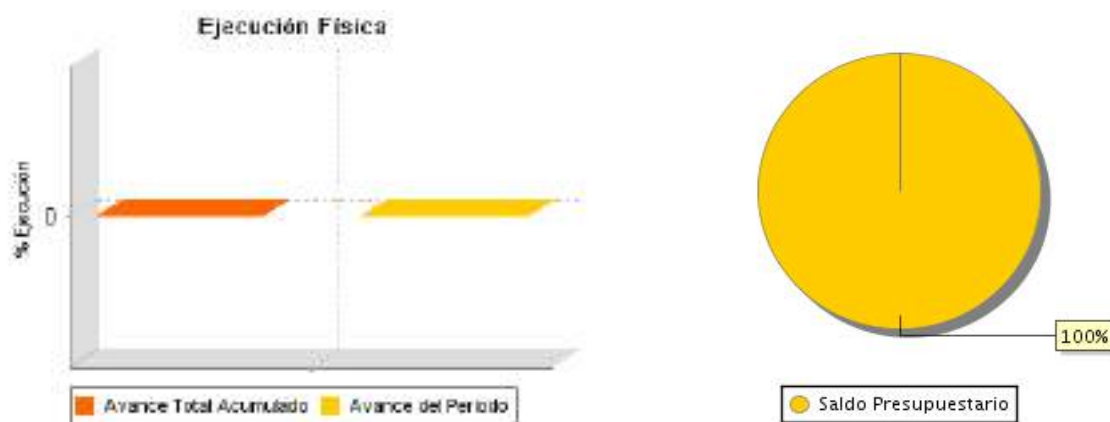


SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del primer cuatrimestre se ha elaborado el borrador de PBC de las obras Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para la ciudad de Carapeguá, que se encuentra en proceso de revisión en la UOC del MOPC y cumpliendo con todos los requisitos para su publicación en el portal de la DNCP. Se espera dentro del segundo cuatrimestre publicar dicho llamado.

Proyecto	Mejoramiento Sistemas de Agua y alcantarillado Sanitario de Ciudad del Este y Presidente Franco		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	883		
Financiamiento	BID , JICA		
Costo del Proyecto	USD	200.000.000	GS. 1.276.400.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
0	1.276.400.000.000	0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
11/05/2023	11/05/2029	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
0,82 %	0,82 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
48.589.351.420	0	0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

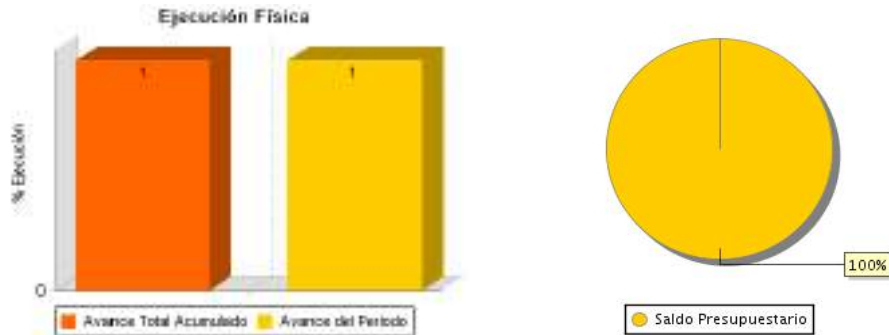

SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del presente cuatrimestre se ha realizado una Solicitud de Prórroga según Nota MOPC N° 386 / 2024 por 180 días contados a partir del 02/05/24, atendiendo a que están pendientes 2 requisitos de las condiciones previas:

1. Entrada en vigor del acuerdo entre la JICA y el prestatario, en trámites por falta de la aprobación de JICA.
2. Cuarta cuenta solicitada por JICA, que ya está en trámites del MEF;


Se ha publicado el llamado de Precalificación para la Contratación de Diseño y Construcción de Obras de Captación, Tratamiento y Almacenamiento de Agua Potable para el Área Metropolitana de Ciudad del Este. Se estima que dentro del segundo cuatrimestre será publicado el PBC para la Contratación de Diseño y Construcción de Obras.

Dentro del primer cuatrimestre se ha elaborado el PBC para el llamado del Diseño y Construcción de Sistema de Tratamiento y Disposición final de Aguas Residuales, Construcción de Estaciones de Bombeo, el cual se encuentra en el Bid para su no objeción y posterior publicación en el portal de la DNCP dentro del segundo cuatrimestre del año.

Se ha recibido la manifestación de interés del Llamado MOPC N° 58/2023 para la Contratación de Servicios de Consultoría para la Fiscalización, la cual se está evaluando para la conformación de la lista corta.

Proyecto	Construcción de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales / Sistema de agua Santa Rosa del Aguaray			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	889			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	9.886.028	GS.	73.525.949.206
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0		73.525.949.206		0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
N/A		-		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			0,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
12.500.000.000		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

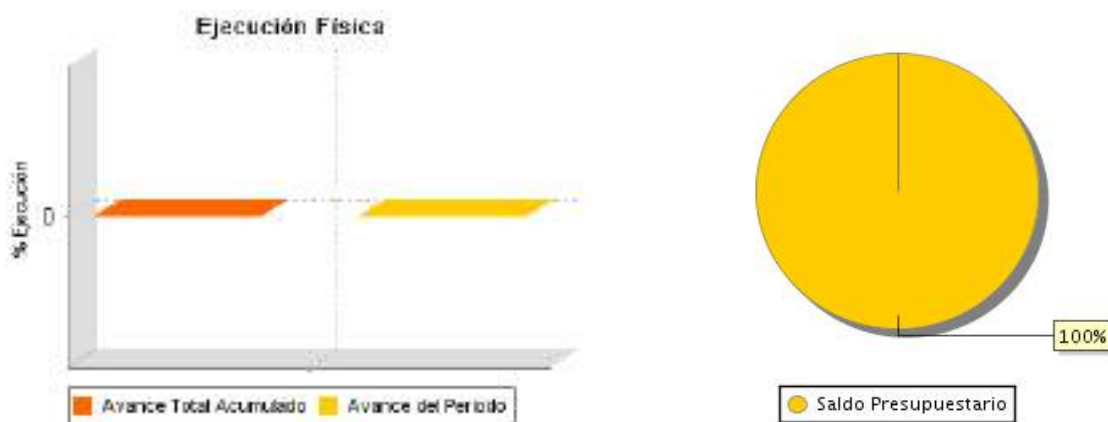


SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del primer cuatrimestre se ha elaborado el borrador de PBC de las obras Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para la ciudad de Santa Rosa, que se encuentra en proceso de revisión en la UOC del MOPC y cumpliendo con todos los requisitos para su publicación en el portal de la DNCP. Se espera dentro del segundo cuatrimestre publicar dicho llamado.

Proyecto	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	892			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	51.611.968.238
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
49.713.416.123	1.898.552.115		96,32%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
25/11/2019	25/11/2022		25/11/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/2024		Porcentaje Ejecutado	
11.871.359.178	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

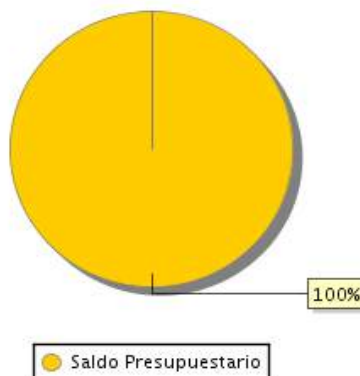


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto están prácticamente culminada. En este cuatrimestre se realizaron trabajos de terminación de pisos, trabajos de Instalaciones eléctricas, pluviales y agua corriente, además de terminación y ajuste de aberturas. En proceso la gestión de ajuste del costo total antes la DGIP.

Proyecto		Mejoramiento del edificio central del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA)			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		957			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	10.905.509.073
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
8.719.972.546		2.185.536.527		79,96 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/06/2022		01/06/2023		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			52,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
3.597.384.483		694.280.715		19,30 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

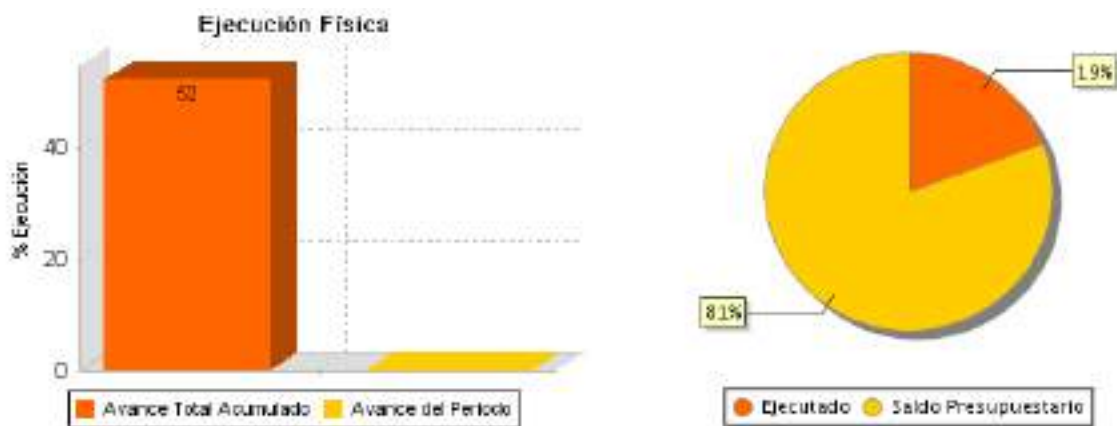


SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en este primer cuatrimestre las obras de mejoramiento del Edificio Central del MINNA se encuentra en proceso de obtención de la recepción provisoria, se están realizando arreglos en manpostería, pisos, ventanas, plomería, electricidad y otras obras menores más.

Proyecto	Construcción de Instalaciones Turísticas en la Reserva Ecológica Banco San Miguel, Asunción		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	982		
Financiamiento	BIRF		
Costo del Proyecto	USD	11.137.827	GS. 77.964.786.690
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
0	77.964.786.690	0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
24/11/2023	29/12/2028	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Municipal	Asunción		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
1,88 %	1,88 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
73.000.000	0	0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

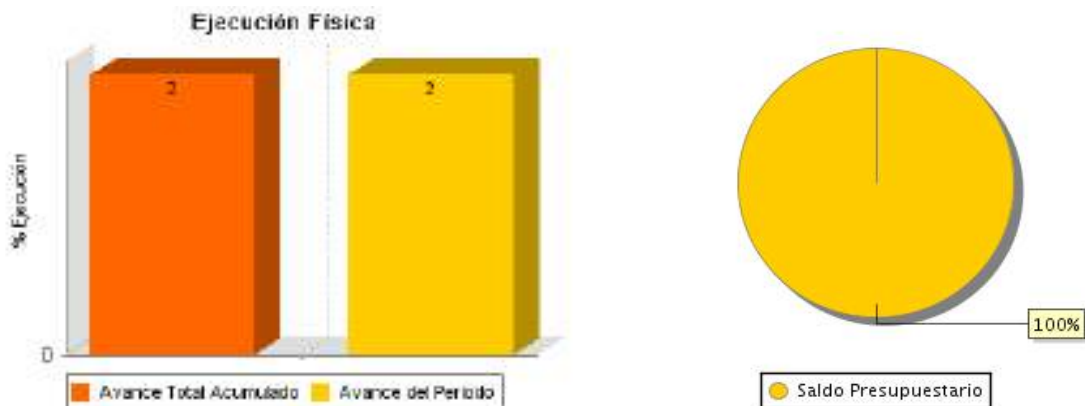


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se reporta que se realizaron las gestiones para prever los créditos presupuestarios a través de una modificación presupuestaria a fin de realizar la regularización el pago directo en concepto de Comisión Inicial, conforme a lo establecido en la sección 2.03 del Contrato de Préstamo, que al cierre del cuatrimestre aún no se hizo efectiva. Así mismo, se encuentra en etapa de elaboración y revisión de Pliegos de Bases y Condiciones y Términos de Referencia para los distintos procesos de licitaciones y contratos.

Proyecto	Construcción del Distrito Eco Inclusivo de Asunción			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	983			
Financiamiento	BIRF			
Costo del Proyecto	USD	66.761.641	GS.	467.331.485.250
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0	467.331.485.250		0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/11/2023	29/12/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Asunción			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,62 %			1,62 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
7.559.450.000	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

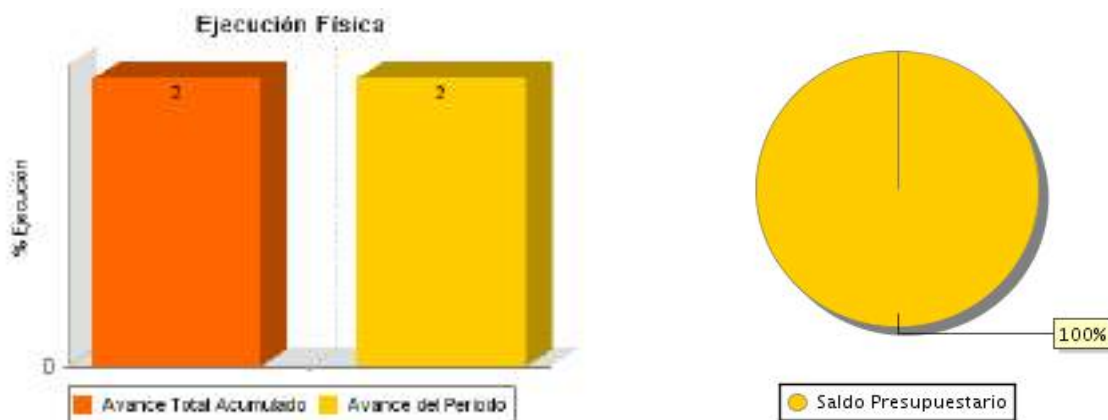


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se reporta que se realizaron las gestiones para prever los créditos presupuestarios a través de una modificación presupuestaria a fin de realizar la regularización el pago directo en concepto de Comisión Inicial, conforme a lo establecido en la sección 2.03 del Contrato de Préstamo, que al cierre del cuatrimestre aún no se hizo efectiva. Así mismo, se encuentra en etapa de elaboración y revisión de Pliegos de Bases y Condiciones y Términos de Referencia para los distintos procesos de licitaciones y contratos.

Proyecto	Mejoramiento y Revitalización Urbanística del Centro Histórico de Asunción (CHA)			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	985			
Financiamiento	BIRF			
Costo del Proyecto	USD	20.958.011	GS.	146.706.073.500
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0	146.706.073.500		0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/11/2023	29/12/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Asunción			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,88 %			1,88 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
897.900.000	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

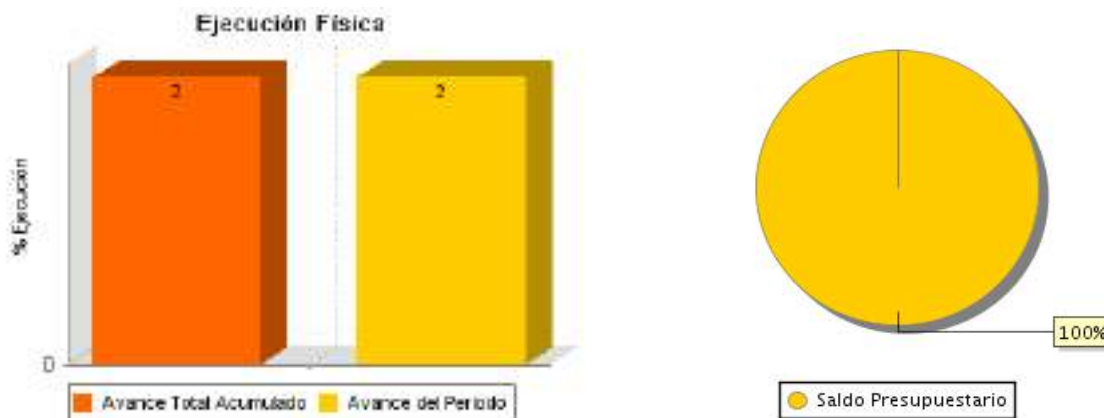


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se reporta que se realizaron las gestiones para prever los créditos presupuestarios a través de una modificación presupuestaria a fin de realizar la regularización el pago directo en concepto de Comisión Inicial, conforme a lo establecido en la sección 2.03 del Contrato de Préstamo, que al cierre del cuatrimestre aún no se hizo efectiva. Así mismo, se encuentra en etapa de elaboración y revisión de Pliegos de Bases y Condiciones y Términos de Referencia para los distintos procesos de licitaciones y contratos.

Proyecto	Mejoramiento del Parque Caballero en Asunción			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	987			
Financiamiento	BIRF			
Costo del Proyecto	USD	13.726.991	GS.	96.088.938.750
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución		
0	96.088.938.750	0,00 %		
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga		
24/11/2023	29/12/2028	N/A		
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Asunción			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total		
1,87 %		1,87 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado		
970.900.000	0	0,00 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

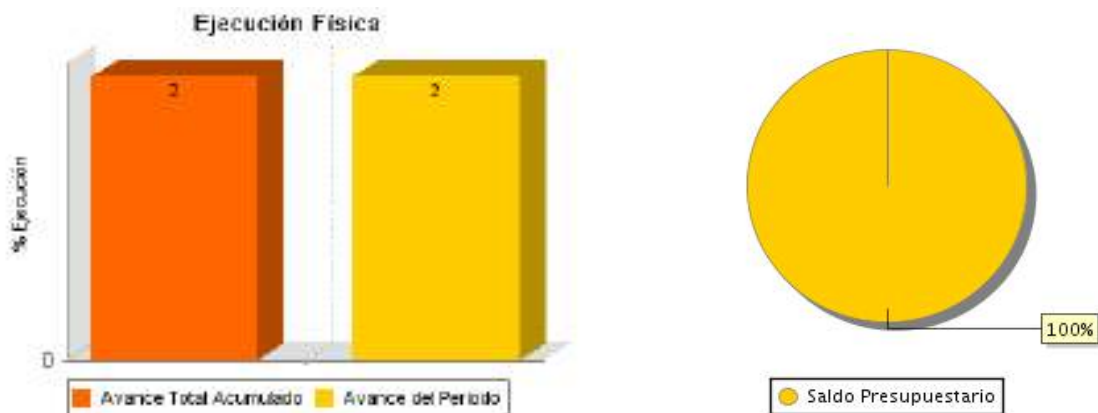

SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se reporta que se realizaron las gestiones para prever los créditos presupuestarios a través de una modificación presupuestaria a fin de realizar la regularización el pago directo en concepto de Comisión Inicial, conforme a lo establecido en la sección 2.03 del Contrato de Préstamo, que al cierre del cuatrimestre aún no se hizo efectiva. Así mismo, se encuentra en etapa de elaboración y revisión de Pliegos de Bases y Condiciones y Términos de Referencia para los distintos procesos de licitaciones y contratos.
