



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO


## SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

Mayo - Agosto 2024



Proyecto	Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA.		
OEE	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL		
Código SNIP N°	710		
Financiamiento	BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	16.306.294	GS. 91.315.246.400
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
48.775.342.841	42.539.903.559	53,41 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
26/03/2020	27/03/2025	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
10,20 %		67,30 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
21.563.877.401	9.767.512.211	45,30 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

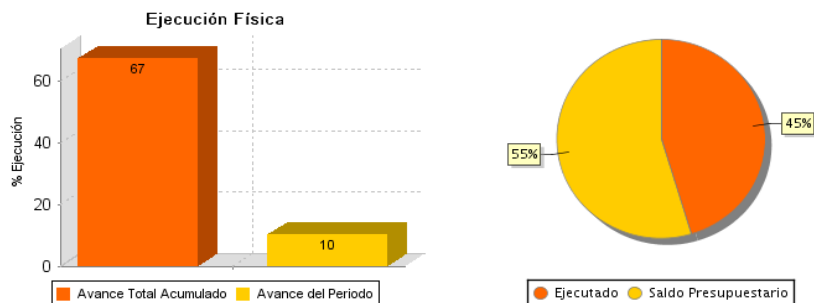

#### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora reportó que en el segundo cuatrimestre del presente periodo fiscal se elaboraron las especificaciones técnicas para la compra de tablets rutgerizadas en todo el territorio nacional para las unidades zonales del SENACSA. El objetivo del mismo es equipar en tecnología para el uso del Sistema de Sanidad Animal (SISA).

En lo referente al fortalecimiento del laboratorio del SENACSA la empresa consorcio Grupo mas-VTG entregó el segundo informe de soporte técnico, así como el consultor contratado para la formación de la Red de Laboratorios entregó el segundo informe de avance.

Por otra parte, se avanzaron con las obras de construcción de las coordinaciones de las siguientes Regiones: en Pozo Colorado (terminación de pisos, mantenimiento de techos, paredes, terminación de aljibe, tanque elevado, muralla perimetral, entre otros), en San Estanislao, (mampostería planta baja y planta alta, techos, muralla perimetral, revoque de paredes interiores, terminaciones, pinturas, instalaciones eléctricas, pluviales), en Agua Dulce, (culminación del techo, mampostería, muralla perimetral, aljibe, tanque elevado, revoque de paredes internas, mampostería externa, pintura, terminaciones, instalaciones eléctricas), e Ypéhu (techo culminado, mampostería, muralla perimetral, revoque interior, pinturas, exteriores, instalaciones eléctricas).

Así mismo, la empresa New technology Solutions que desarrolla el Sistema de Identificación Animal del Paraguay entregó el informe de Avance, el cual se encuentra aprobado por el área técnica. Además, la consultoría de corte canal o Dressing realizó la entrega del segundo informe y la misma se encuentra aprobado por el área técnica.

Así también, la consultoría del Plan sanitario sector apícola realizó la entrega del informe final para aumentar la competitividad a nivel nacional e internacional y se elaboraron los términos de referencia para la consultoría de reformulación del plan sanitario para rabia en animales susceptibles. De igual manera se encuentra en evaluación para la consultoría de reformulación de la Dirección de cuarentena conforme a estándares internacionales y se presentaron los avances de la consultoría para el levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa y sus efectos.

Además, se iniciaron los trámites para la compra de bastones identificadores electrónicos para el Sistema de Trazabilidad y la compra de licencias Oracle.
