



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS


Enero - Abril 2024

 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública



<b>Proyecto</b>		Ampliación y Reposición de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del MEC, en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del País.		
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
<b>Código SNIP N°</b>		325		
<b>Financiamiento</b>		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b>	578.568.001.943
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
519.450.737.205		59.117.264.738		89,78 %
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
11/09/2014		11/09/2017		30/06/2024
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
3,31 %			92,83 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
63.733.322.069		5.338.509.736		8,38 %

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

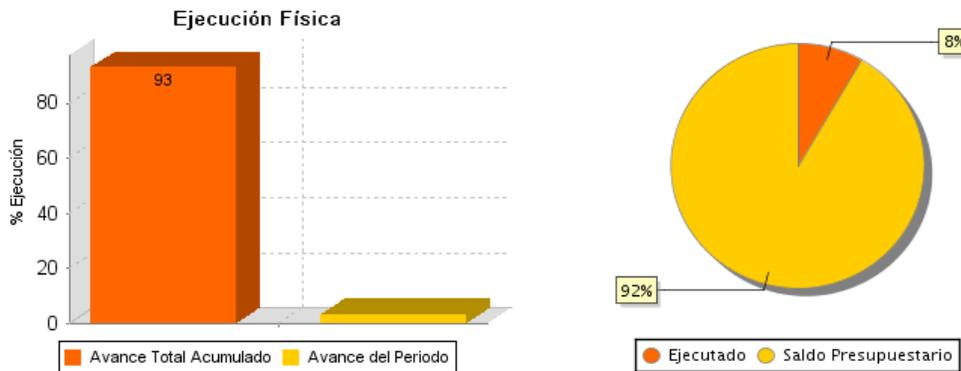

#### SITUACIÓN ACTUAL


En el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se realizó la supervisión y fiscalización de 47 obras en las Instituciones escolares en los Departamentos de: Concepción 12, Canindeyú 19, Amambay 11, Misiones 4 y Paraguari 1.

Asi también, culminaron 13 obras en Instituciones Escolares en los Departamentos de Canindeyú 6, Concepción 5, Misiones 2. Dichas obras terminadas incluyen: 6 aulas generales simples, 2 aulas generales dobles, 5 aulas simples, 1° ciclo Enseñanza Escolar Básica con sanitario higiénico integrado. Las obras cuentan con sus respectivas actas de recepción definitivas.

Por otro lado se realizó la entrega de muebles consistentes en: armarios, estantes, escritorios, mesas de trabajos, mesas, sillas y mesas de clase, en Instituciones Escolares de los siguientes Departamentos: Asunción 7, Caazapá 19, Itapúa 19, Alto Paraná 19, Misiones 15, Central 15, Cordillera 18, Ñeembucú 12, y Paraguari 14.

Proyecto	Ampliación en la atención educativa desde la gestación hasta 5 años			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	388			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	591.638.288.812
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
375.161.788.502	216.476.500.310		63,41 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/05/2015	31/12/2018		30/06/2027	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total		
3,27 %		76,13 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
72.639.815.853	3.717.296.268		5,12 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

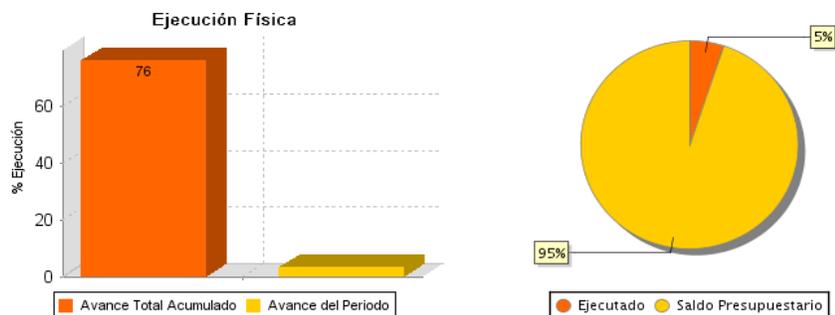

#### SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal la Unidad Ejecutora reportó que culminaron 15 obras adjudicadas a la firma CONSTRUTEX a través del ID N° 406.836. Es importante destacar que algunas instituciones cuentan con el prototipo I que implica una sala, con depósito, baño y galería y el prototipo doble sala con depósito, sanitario y galería.

Así también, se contrató a 45 educadoras comunitarias para prestar servicios en instituciones educativas de comunidades indígenas de los departamentos de: Alto Paraná, Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Guairá, Itapúa, Presidente Hayes y San Pedro.

Se adjudicó a la una firma consultora del proceso de CD N° 01/2024 "CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, PERIODO 2023 DEL PROGRAMA EDUCATIVO PRIMERA INFANCIA" – AD REFERENDUM ID N° 423.814, mediante Resolución UEPP N° 109/2024.


Se realizó la distribución de 57 kit de mobiliario (armario para docente bajo, armario para docente alto, estante con cubetas de plástico, perchero con colgador, mesa para grupos de 4 niños, sillas para niños y para docentes), para espacios educativos de primera infancia, en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Presidente Hayes y San Pedro.

Por otr aparte se distribuyó 61 kit de materiales didácticos, de los cuales 3 kit se entregaron en los espacios de atención socioeducativo para contexto de encierro en los departamentos de Itapúa, Caaguazú y Asunción y 58 para espacios de prejardín y jardín de los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Presidente Hayes y San Pedro.

Los materiales didácticos se citan a continuación: pelotas, kit de muñecos sexados, kit de juegos de playa y de encastre, prono supinador didáctico, juegos simbólicos de doctor, hogar, carpintería, supermercado, titiritero, títeres de dedos, juegos didácticos de enhebrado, mesa de agua y arena, casa para jugar, set de instrumentos musicales y de seguridad vial, tarjetas con números, balanza didáctica, kit de ciencias para niños, rompecabezas, set de cubos para apilar, bloques lógicos, dominó, colchonetas, alfombras y mini basquet, peluche antialérgico, alfombras, entre otros.

Proyecto	Investigación Evaluación estandarizadas de desempeño a estudiantes			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	389			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	63.790.750.573
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
62.890.490.793	900.259.780		98,59 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
30/12/2014	30/12/2021		31/07/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,03 %			97,21 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
1.250.000.000	721.292.539		57,70 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

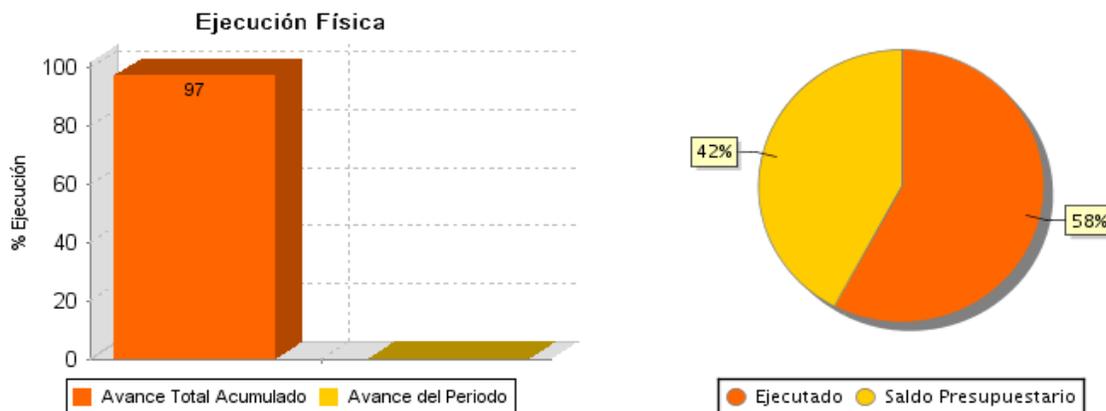

#### SITUACIÓN ACTUAL


En el primer cuatrimestre del presente periodo fiscal la Unidad Ejecutora reportó que se realizó la verificación de los instrumentos aplicados en los 17 departamentos y la capital del país.

Además, finalizó la revisión y consistencia de la base de datos de los cuestionarios y rendimiento académico de los 17 departamentos aplicados en 4° y 7° grado de la Enseñanza Escolar Básica y 1° y 3° Curso de la Enseñanza Media.

Se realizó la auditoría externa financiera y de gestión del ejercicio 2023.

<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de condiciones de aprendizaje con incorporación de TIC		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
<b>Código SNIP N°</b>	394		
<b>Financiamiento</b>	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b> 639.856.204.101
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
583.310.764.692	56.545.439.409		91,16 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
25/11/2015	25/12/2019		30/06/2024
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0,50 %		79,02 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
43.051.032.610	3.505.285.880		8,14 %

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

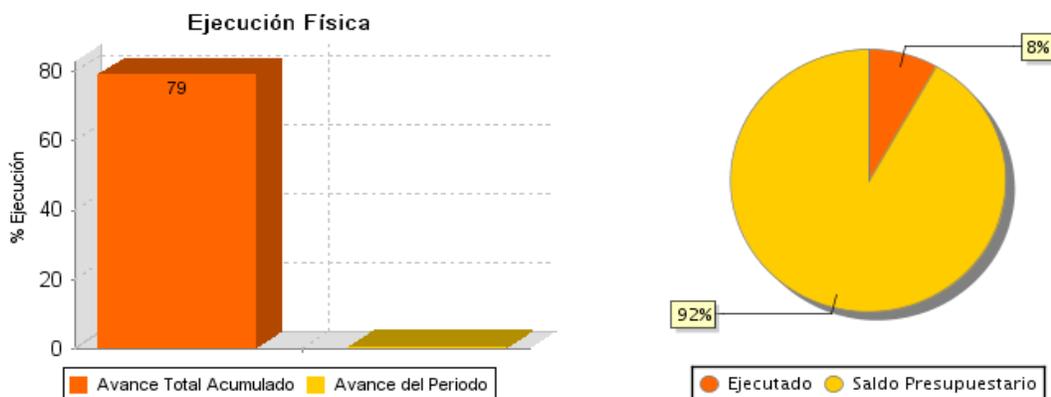

#### SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se proveyó de señal de internet satelital a 199 instituciones educativas de alcance nacional a través del llamado ID N° 419.352.


Por otro lado, culminó la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de los equipos de infraestructura de conectividad en el marco del llamado ID N° 417.928 "AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY", benefició a 1060 establecimientos educativos en los 17 departamentos del país y Capital.

Así también, se realizaron los cursos de capacitaciones para gestores de TIC, con 2596 docentes inscriptos.

Se realizó la auditoría externa financiera y de gestión del periodo 2023.

Proyecto	Capacitación Apoyo a la ampliación de la jornada escolar.		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	570		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	19.720.000	GS. 141.761.952.800
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
98.383.165.099	43.378.787.701	69,40 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
31/10/2017	10/5/2024	10/05/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
4,63 %	62,07 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
26.356.513.992	6.526.246.187	24,76 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

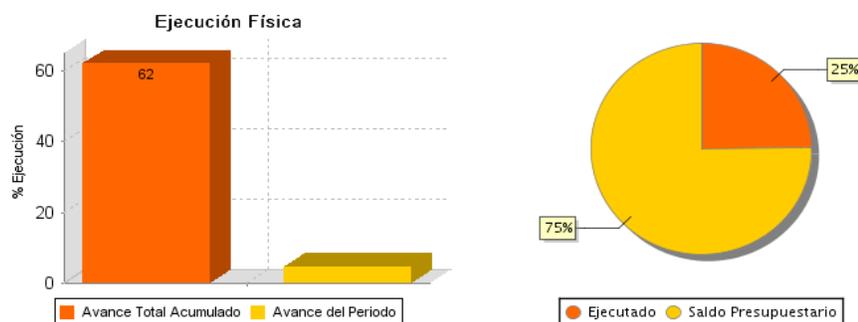

#### SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre 2024 la Unidad Ejecutora reportó que se ejecutaron los contratos individuales para "Edición de contenidos de cuadernos de aprendizajes y de guías didácticas de lengua guaraní del 1º al 6º grado de la Escuela Escolar Básica" y para "Elaboración de materiales educativos para el área de comunicación (guaraní como lengua materna) para el 1º y 2º grado de la EEB". Así también siguen en ejecución el contrato con el Centro Cultural Paraguayo Americano para la implementación de inglés sin límites y los contratos con los proveedores Mercurio y Frígon a través del llamado ID N° 424.449 para el servicio de impresión de materiales didácticos para el 1º y 2º ciclo de EEB, concluidos los lotes a cargo de las empresas Servipress y Alamo.

Se realizó el Convenio interinstitucional con DINACOPA para el servicio de distribución de materiales didácticos en la Capital y los departamentos de: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Central, Neembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

Además, se llevó a cabo la implementación de Escuelas Abiertas en 150 instituciones educativas focalizadas en el proyecto en Capital y 15 departamentos del país, Capital 9, Concepción 5, San Pedro 5, Cordillera 17, Guairá 12, Caaguazú 12, Caazapá 4, Itapúa 12, Misiones 8, Paraguari 19, Alto Paraná 5, Central 17, Neembucú 7, Canindeyú 2, Presidente Hayes 4, y Boquerón 2.


Entre las actividades desarrolladas por la organización se encontraban: realizar el proceso de selección de facilitadores, capacitar en forma presencial a los facilitadores, proveer los insumos deportivos, educativos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades, en base al programa de actividades propuesto que incluían actividades dentro y fuera del aula, en base a los tres ejes del proyecto: el arte, el deporte y la lecto-escritura.

Por otro lado, se obtuvo la no objeción y se autorizaron por resolución la contratación para las consultarías individuales para la selección de títulos de libros de las áreas de lengua (Castellano – Guaraní), Matemática y Ciencias (Naturales y Sociales), para la adquisición de libros para las bibliotecas de aula.

Las actividades de la auditoría externa del proyecto concluyeron en el primer cuatrimestre con la entrega del informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2023, con la remisión de dicho informe al BID.

Proyecto	Mejoramiento Condiciones de transporte de estudiantes		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	571		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	280.000	GS. 2.012.847.200
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
744.739.141	1.268.108.059		37,00 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/10/2017	10/05/2025		10/06/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1,92 %		6,63 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
530.317.208	0		0,00 %

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

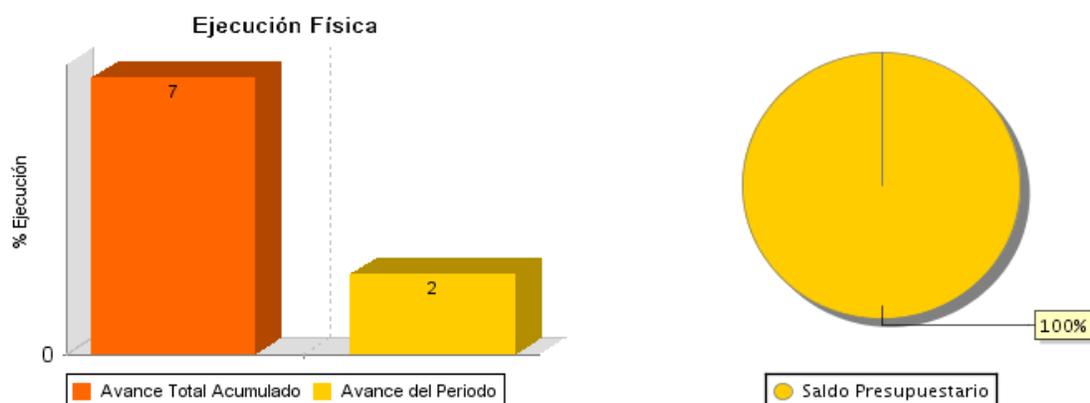


#### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que en el primer cuatrimestre se realizaron las invitaciones para presentación de ofertas para la adquisición de boleto estudiantil en medios magnéticos (tarjetas) para transporte público a las siguientes empresas: Empresa Paraguaya de Servicios S.A.E y Technologies Development of Paraguay S.A.

Conforme a las recomendaciones de las consultorías de viabilidad, (Contrato Nro. 15/2023 Ernest & Young), se iniciarán las gestiones para la contratación del servicio de alquiler de buses escolares para llevar a cabo el programa piloto.

<b>Proyecto</b>	Capacitación y Evaluación de Educación Superior		
<b>OEE</b>	AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR		
<b>Código SNIP N°</b>	644		
<b>Financiamiento</b>	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b> 23.167.811.280
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
22.333.448.197	834.363.083		96,40 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
27/05/2016	27/05/2019		31/12/2025
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0,00 %		83,98 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
1.383.695.299	0		0,00 %

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

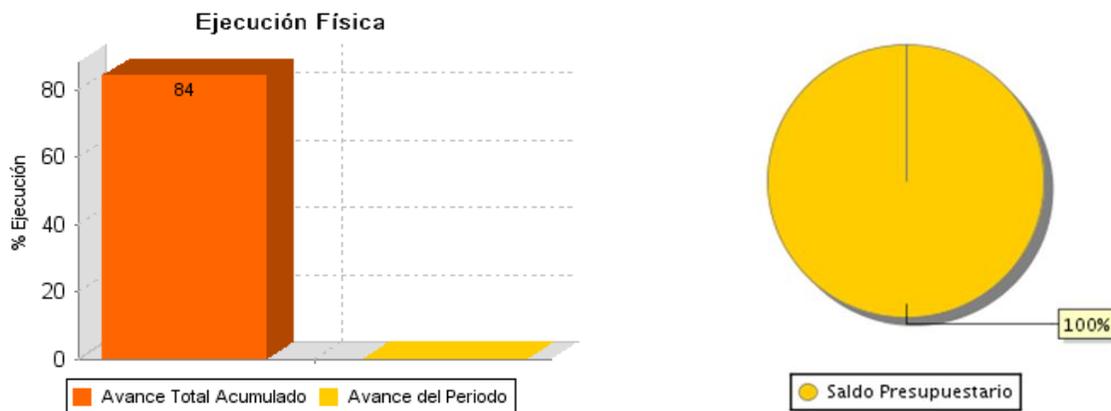


#### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que no se ejecutó en el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal debido a que el plazo del programa se extendió según Resolución CAFFEI N° 16/2022 hasta el 31-12-2025 a efectos de culminar el sistema informático, el cual fue adjudicado a la empresa CIBYRA CONSULTING, bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional (LPN) N° 01/2022. El pago está previsto para el tercer cuatrimestre contra entrega de producto.

Así también, se prevé a partir del segundo cuatrimestre del presente año la contratación de un profesional especialista informático para el control y monitoreo del desarrollo del Sistema de Información, diagnóstico, evaluación, acreditación y seguimiento de la ANEAES. Además, se tiene previsto el pago por la auditoría del programa del ejercicio 2023, contra entrega de producto.

Proyecto	Fomento y apoyo operativo para la ejecución de proyectos del MEC			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	709			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	58.994.841.017
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
45.983.749.372	13.011.091.645		77,95 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/01/2017	30/06/2019		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total		
3,27 %		80,38 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
10.016.360.000	2.003.651.265		20,00 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

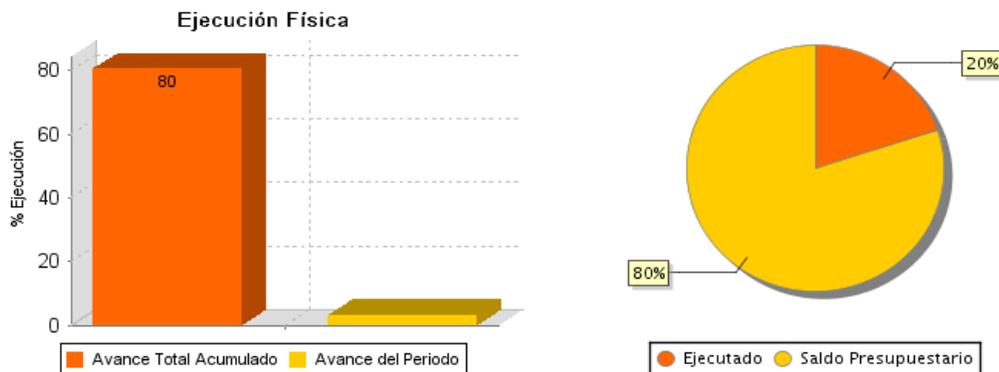

#### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos informó que en el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se realizó el comisionamiento de los funcionarios que conforman esta dependencia para realizar las gestiones administrativas pertinentes (Asesoría Legal y Secretaría). De igual forma, se renovaron los contratos de los personales contratados y se solicitó el comisionamiento de los funcionarios que conforman parte de la Coordinación de Apoyo a la Gestión.

Además, se abonaron los contratos de servicios de mantenimiento de vehículos, limpieza, servicios básicos y combustibles.


Así también, se adjudicó el llamado del ID N° 423.869 "Adquisición de Tóner", además se realizó el pago del alquiler de las oficinas administrativas de la UEPP (edificio Natura -. edificio Presto), correspondiente a los primeros 6 meses de alquiler para el año 2024.

Por otro lado, se gestionó el pago de la patente del parque automotor de la UEPP correspondiente al año 2024.

Se realizó el informe de rendición de cuentas del periodo julio a diciembre 2023.

<b>Proyecto</b>		Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA.	
<b>OEE</b>		SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	
<b>Código SNIP N°</b>		710	
<b>Financiamiento</b>		BID , LOCAL	
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	16.306.294
		<b>GS.</b>	91.315.246.400
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	
42.234.516.919		49.080.729.481	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>	
26/03/2020		27/03/2025	
		<b>Fecha de Prórroga</b>	
		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
5,82 %		62,92 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024</b>	
21.563.877.401		3.226.686.289	
		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
		14,96 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

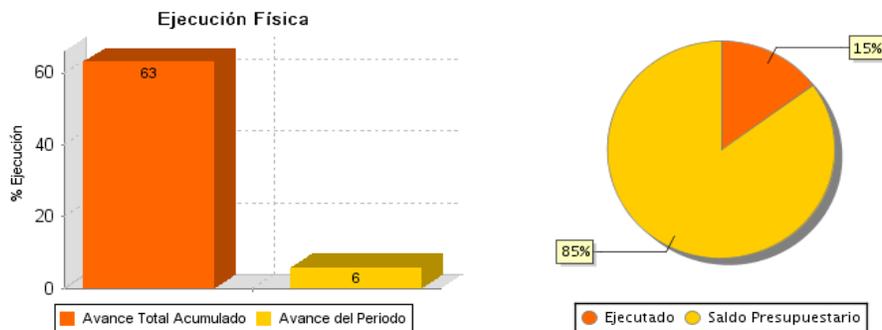

#### SITUACIÓN ACTUAL

Durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, la Empresa IDEATI S.A entregó el informe aprobado por la Dirección General de Sanidad, Identidad y Trazabilidad (DIGESIT), que contempla la gestión de información de brotes de enfermedades y eventos de emergencia sanitaria. Además, se realizaron las gestiones administrativas para la firma del Convenio con el INCAE para realizar la consultoría referente al análisis de costo beneficio del levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa y la situación actual del mercado a nivel internacional.

En lo referente a la consultoría para la red de laboratorio nacional y el SENACSA, se recibió el plan de Trabajo, aprobado por la Dirección General de Laboratorios. Así también, la consultoría de la elaboración del plan sanitario apícola para el aumento de la competitividad a nivel nacional e internacional del sector, se desarrolló por un consultor bajo la supervisión técnica de la (DIGESIT) y finalizó la consultoría de la asistencia al plan maestro de TIC con un informe final.

Por otro lado, las obras ejecutadas por el Proyecto tuvieron los siguientes avances:

En la Construcción de la Unidad Zonal del SENACSA en Agua Dulce, los avances fueron relacionados a la culminación del techo, mampostería, muralla perimetral, aljibe, tanque elevado, revoque de paredes internas.


En la Construcción de la Unidad Zonal del SENACSA en Ypejhu, se cuenta con avance de techo culminado, mampostería, muralla perimetral, revoque interior.

En la Construcción de la Coordinación de Región del SENACSA en San Estanislao, los avances son correspondiente a los rubros de mampostería planta baja y planta alta, techos, muralla perimetral, revoque de paredes interiores.

En cuanto a la Implementación del nuevo DATACENTER para el SENACSA, se realizaron las socializaciones y capacitaciones referente a la migración e instrucciones de uso. Se entregó un informe de auditoría externa al proyecto por la empresa consultora AUDICON al ejercicio 2023, el cual cuenta con la No Objeción del BID

<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnología Agraria.			
<b>OEE</b>	INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA			
<b>Código SNIP N°</b>	786			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	20.000.000	<b>GS.</b>	134.303.639.056
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
22.095.089.519	112.208.549.537		16,45 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
24/04/2022	24/04/2027		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
2,23 %			18,45 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
14.610.868.800	1.415.030.746		9,68 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

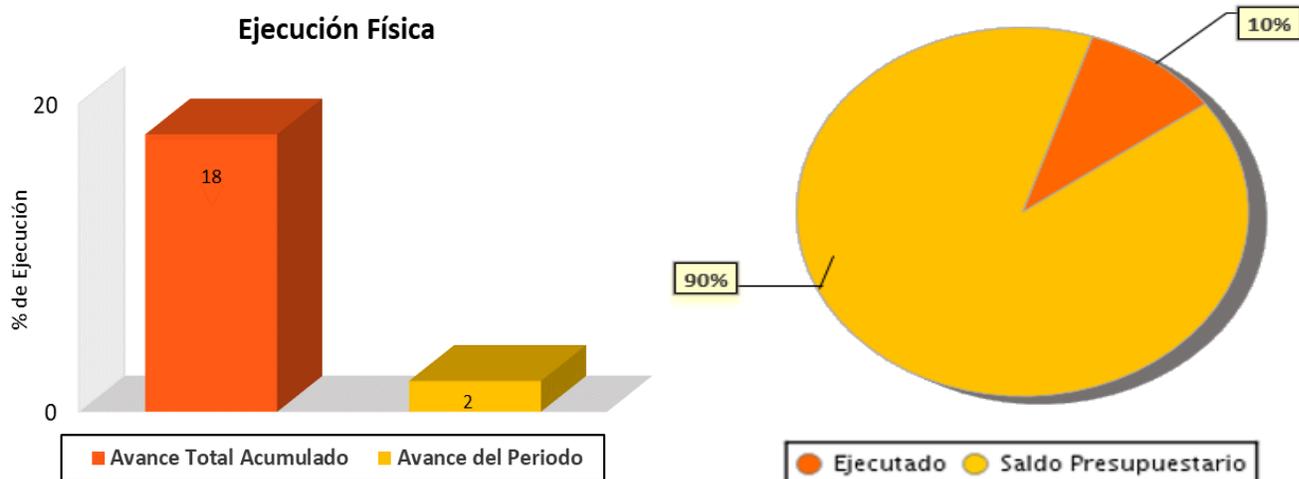


### SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2024 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.

<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Colegios Técnicos		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
<b>Código SNIP N°</b>	972		
<b>Financiamiento</b>	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b> 202.172.259.397
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
1.779.309.390	200.392.950.007		0,88 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
21/01/2022	31/07/2025		N/A
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0,11 %		3,25 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
58.455.292.815	904.940.652		1,55 %

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

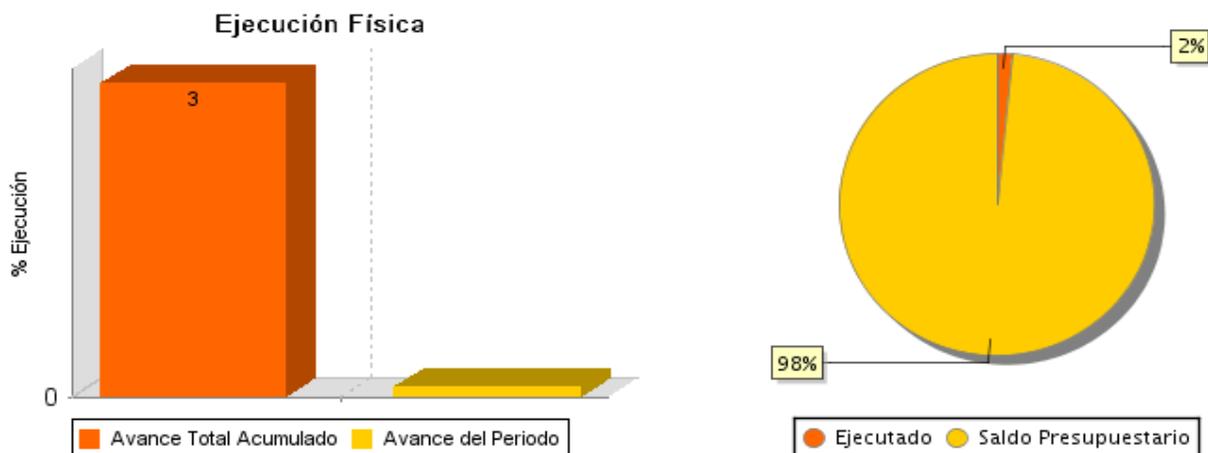


### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora reportó que en el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se realizó el relevamiento y desarrollo de proyecto ejecutivo en 30 Instituciones Escolares en los distintos Departamentos Geográficos de País.

<b>Proyecto</b>	Capacitación de las competencias profesionales de educadores				
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
<b>Código SNIP N°</b>	1071				
<b>Financiamiento</b>	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A		<b>GS.</b>	175.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
600.000.000		174.400.000.000		0,34 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
21/04/2023		21/04/2026		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
Nacional	N/A				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
0,83 %			4,97 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
37.490.000.000		600.000.000		1,60 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

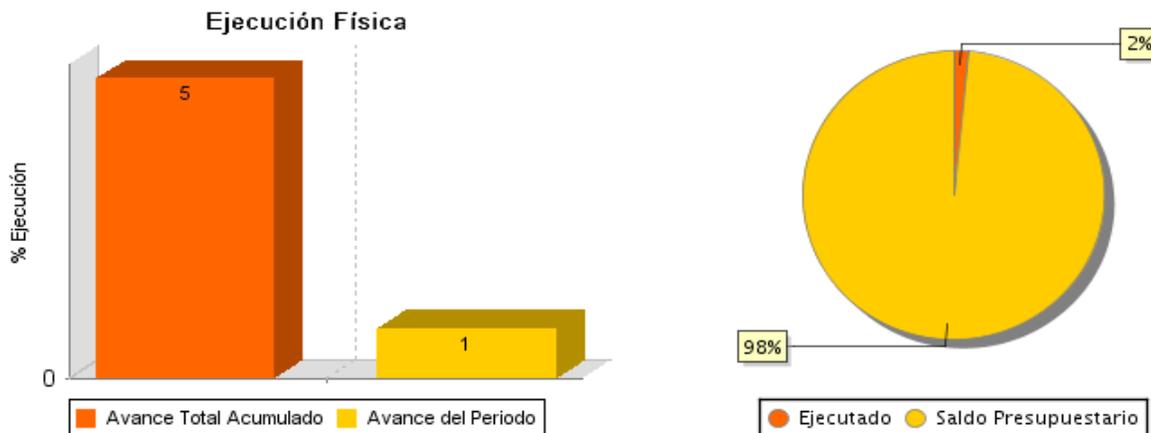

#### SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal la Unidad Ejecutora reportó que se inició el curso de "Capacitación para la formación de docentes en servicio del 1er y 2do ciclo de la Enseñanza Escolar Básica en estrategias de enseñanza de lectura y escritura" para 2.000 coordinadores pedagógicos y 12.000 docentes de instituciones educativas oficiales de todos los departamentos del país y Asunción.
